


REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTRE DE L'AGRICULTURE

SECOND PROJET D'URGENCE D'APPUI A LA
SECURITE ALIMENTAIRE
PUSA2



RAPPORT D'ACTIVITES

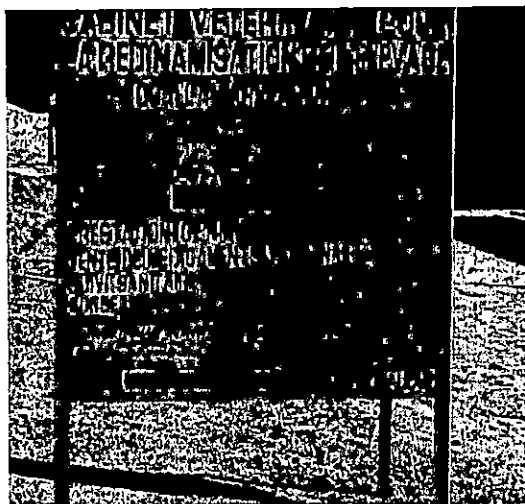

ANNEE 2013

Janvier 2014

TABLE DES MATIERES

LISTE DES ACRONYMES	3
FICHE SIGNALÉTIQUE DU PROJET	4
I INTRODUCTION.....	5
II ETAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES PAR COMPOSANTES ET SOUS COMPOSANTES.....	6
2.1 COMPOSANTE 1 : RESTAURATION DES ACTIFS PRODUCTIFS DES MENAGES RURAUX EN SITUATION D'INSECURITE ALIMENTAIRE	6
2.1.1 <i>Sous composante Recapitalisation du cheptel</i>	6
2.1.2 <i>Sous composante Extension du système de banques villageoises de soudure</i>	8
2.2 COMPOSANTE 2 : RENFORCEMENT DES SYSTEMES DE PRODUCTION DE RIZ IRRIGUE	10
2.2.1 <i>Sous composante Réhabilitation de périmètres irrigués</i>	10
2.2.2 <i>Sous composante Appui à l'ONAHA</i>	13
2.2.3 <i>Sous composante Soutien au système de multiplication et de distribution des semences des coopératives</i>	15
2.2.4 <i>Sous composante Renforcement des coopératives</i>	16
2.3 COMPOSANTE 3 : COORDINATION, GESTION ET SUIVI EVALUATION	18
2.3.1 <i>Sous composante Coordination et Gestion du projet</i>	18
2.3.2 <i>Sous composante Suivi évaluation</i>	18
III SITUATION FINANCIERE	19
IV PERSPECTIVES.....	22
ANNEXE 1 : REALISATIONS FINANCIERES PAR COMPOSANTES	23
ANNEXE 2 : SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE	27

Liste des acronymes

AHA : Aménagement Hydro Agricole

AE : Auxiliaire d'élevage

BEEI : Bureau d'Etudes Environnementales et Etudes d'Impact

CDR : Contribution au Développement Rural

DGGR : Direction Générale du Génie Rural

DAC/POR/MAG : Direction des Actions Coopératives et de la Promotion des Organisations Rurales du Ministère de l'Agriculture

CPS : Centre de Prestation de Service

Coges : Comité de gestion

FPCR : Fonds fiduciaire en réponse à la crise des prix alimentaires

FUCOPRI : Fédération des Unions des Coopératives Productrices de Riz

IDA : Association Internationale de Développement

INRAN : Institut National de Recherche Agronomique du Niger

KB : Kourani Baria

ODP : Objectif de Développement du Projet

ONAHA : Office National des Aménagements Hydro-Agricoles

ONG : Organisation Non Gouvernementale

PTBA : Programme de Travail et Budget Annuel

PUSA2 : Deuxième Projet d'Urgence d'appui à la Sécurité Alimentaire

PRODEX : Projet de Développement des Exportations et des marchés agro-sylvo-pastoraux

SLK : Sona Lossa Kokomani

SVPP : Service Vétérinaire Privé de Proximité

UCTF : Unité de Coordination Technique et Fiduciaire

VSF : Vétérinaires Sans Frontières

BAB : Banque Aliments pour Bétail.

FICHE SIGNALÉTIQUE DU PROJET

Intitulé : Deuxième Projet d'Urgence d'Appui à la Sécurité Alimentaire (PUSA2)

Objectif : l'Objectif de Développement du Projet (ODP consiste à accroître la production rizicole dans les zones visées et à restaurer le capital productif des ménages cibles en situation d'insécurité alimentaire dans la région de Tillabéry.

Bailleur de fonds : IDA/ FPCR, Niger

Tutelle : Ministère de l'Agriculture

Tableau 1 : Plan de financement IDA/FPCR du PUSA2

Composantes	Région	En dollars	En F CFA
1. Restauration des actifs productifs des ménages ruraux en situation d'insécurité alimentaire	Tillabéri	2 000 000	1 000 000 000
2. Renforcement du système de production de riz irrigué	Tillabéri	12 000 000	6 000 000 000
3. Coordination, Gestion Suivi et Evaluation	(UCTF/PRODEX)	1 000 000	500 000 000
TOTAL		15 000 000	7 500 000 000

1\$US = 500 F CFA (Taux de base)

Date d'approbation : 14 décembre 2010

Date signature de l'Accord de Don : 29 mars 2011

Date mise en vigueur : 14 juin 2011

Date de clôture initiale : 29 Novembre 2013

Nouvelle date de clôture : 31 Mai 2014

Organe délibérant : Comité de Pilotage

Organe exécutif : Unité de Coordination Technique et Fiduciaire du Projet (UCTF)

Zone d'intervention : Région de Tillabéri

Domaines d'intervention : Sécurité alimentaire

Groupes Cibles : Ménages vulnérables affectés par la crise alimentaire de la campagne agricole 2009

I INTRODUCTION

Le Niger a obtenu de la Banque mondiale à travers le Fonds fiduciaire en réponse à la crise des prix alimentaires (FPCR), le financement du second Projet d'Urgence d'appui à la Sécurité Alimentaire (PUSA2) dans la région de Tillabéri. Ce projet vise l'atténuation des effets de la crise alimentaire et pastorale de 2009 qui a affecté les populations les plus vulnérables du Niger.

La mise en œuvre du projet qui a démarré en juin 2011 s'est poursuivie en 2013, année de clôture initiale du projet. Cependant, cours du mois de juin 2013, un plan d'action pour une prorogation du projet a été élaboré et soumis à la Banque Mondiale. En effet, la prorogation du projet est requise pour permettre la finalisation des travaux de réhabilitation des AHA de Sona/Lossa/Kokomani et les activités qui y sont liées, notamment le suivi et contrôle des travaux, le suivi de la mise en œuvre du PGES du chantier, le fonctionnement, etc... La nouvelle date de clôture du projet est donc le 31 mai 2014, soit 6 mois de prolongation.

Au cours de l'année 2013, la mise en œuvre des activités a concerné les différentes composantes du projet. On note au niveau de la première composante :

- la poursuite du suivi des banques de soudure par l'ONG Africare ;
- l'organisation de sessions de recyclages des Auxiliaires d'élevage et des membres des comités de gestion des banques d'aliments pour bétail dans le cadre d'un contrat avenant avec VSF (volet recheptelisation).

Concernant la seconde composante, on note :

- La réalisation à Kourani Baria de certaines parties restantes des travaux de réhabilitation de l'AHA par L'Entreprise DKO ;
- la poursuite des travaux de réhabilitation des AHA de Sona, Lossa et Kokomani. Ces derniers travaux sont terminés concernant le traitement des Koris (lot 4) mais sont en cours concernant les travaux sur le périmètre (lots 1, 2, 3) ;
- la finalisation du plan d'action par les consultants dans le cadre de la restructuration de l'Office National des Aménagements Hydro-Agricoles ;
- l'organisation en collaboration avec l'INRAN de deux formations des encadreurs des aménagements hydro agricoles (AHA), des agents de l'agriculture et de paysans multiplicateurs de semences en techniques de production, conservation , conditionnement et certification de semences de riz ;
- la poursuite du suivi de la mise en valeur des périmètres par l'ONAHA et du suivi de la gestion des coopératives par le CPS.

II ETAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES PAR COMPOSANTES ET SOUS COMPOSANTES

2.1 Composante 1 : Restauration des actifs productifs des ménages ruraux en situation d'insécurité alimentaire

Cette composante vise à appuyer les ménages d'éleveurs et d'agriculteurs dans la Région de Tillabéry (départements de Ouallam et Tillabéri), à se relever de la crise alimentaire et de mieux se préparer à faire face aux crises futures. Les bénéficiaires sont identifiés grâce aux mécanismes de ciblage, et sont appuyés à travers : la recapitalisation du cheptel de petits ruminants des ménages vulnérables, la création et la gestion de banques de soudure villageoises.

2.1.1 Sous composante Recapitalisation du cheptel

X *Rappels* : Dans le cadre de ^{la} mise en œuvre de cette sous composante, un contrat a été signé avec le Consortium d'ONGs Vétérinaires Sans Frontières/Karkara et au cours de l'année 2012, les activités suivantes ont été réalisées :

- la distribution de 16800 chèvres à 5600 ménages ;
- la mise en place de 5 banques d'aliments pour bétail et la formation de 25 femmes membres des comités de gestion ;
- la mise en place d'un dispositif de suivi sanitaire des animaux (1 Clinique vétérinaire rurale à Ouallam et 30 auxiliaires d'élevage installés dans 30 villages).

Pour l'année 2013, le projet a convenu d'un avenant au contrat VSF pour la mise en place d'une équipe opérationnelle minimale qui a assuré la formation des AE et des membres des comités de gestion des BAB, le renouvellement des stock des BAB, la distribution de 200 têtes de petits ruminants ainsi que le suivi des animaux distribués assuré par le vétérinaire privé.

Activité 1.1.a : Acquérir le reliquat de petits ruminants

Le village de Tondikiwindi a été retenu pour la distribution des deux cent (200) têtes de chèvres supplémentaires pour atteindre le chiffre de 17 000 chèvres prévues par le projet. Deux critères ont conduit à ce choix, il s'agit des pertes énormes subies suite aux inondations de 2012, mais également des résultats du suivi zootechnique. En effet, c'est le site ayant enregistré un des taux les plus bas en matière de sorties d'animaux non justifiées. D'autre part c'est un site où le comité de gestion et les bénéficiaires sont engagés dans le suivi des animaux et leur entretien. Une situation des pertes par bénéficiaire a été faite avec le comité de recheptellisation et 200 chèvres ont été distribuées les 09, 10 et 13 décembre 2013.

X **Suivi des animaux distribués** : Une série de 5 suivis sanitaires et zootechniques des 16800 chèvres distribuées en 2012 a été effectué par le vétérinaire privé installé à Ouallam. Ces suivis ont lieu au niveau de chacun des villages bénéficiaires. Ils sont consacrés à la récolte de données sur les animaux distribués, notamment les mortalités, les naissances les ventes et autres sorties (vol, confiage...). Les données sont collectées au niveau des comités de recheptellisation ainsi qu'auprès des bénéficiaires. Des interventions sanitaires (vaccinations,

déparasitages) sont faites lors de ces suivis et d'autres soins sont effectués à la demande des Bénéficiaires. Le tableau suivant donne les tendances du cinquième suivi effectué du 18 mai au 5 juin 2013 pour le lot1 et du 11 au 29 septembre 2013 pour le lot2

Tableau2 : Suivi des lot1 et lot2 de chèvres distribués

Lot	Effectif distribué	Naissances	Mortalités		Ventes	Autres sorties	Avortements
			Adultes	Jeunes			
Lot1	3260	1794	474	11	22	671	154
Lot2	13540	10542	1036	373	0	3886	628
Total	16 800	12 336	1 510	384	22	4 557	782
% par rapport à l'effectif distribué		73,43	8,99	2,29	0,13	27,13	4,65

NB : Par « Autres sorties », on entend les animaux déclarés comme perdus ou au pâturage par leurs propriétaires lors du passage de l'équipe vétérinaire. Ils ne sont donc pas forcément et définitivement sortis. Grâce à la sensibilisation de la population sur l'objectif du projet, les ventes ont été faibles. Toutefois, il est possible que les bénéficiaires dissimulent la vente de certains animaux en les déclarants morts.

Activité 1.1.b : Former les AE

Concernant le volet santé animale, deux sessions de recyclage des AE ont été organisées par VSF. Il s'agit de mettre en place les bases d'un service de santé animal de proximité et de ce fait assurer la sécurité de noyaux distribués aux ménages vulnérables. La première session de recyclage des Auxiliaires d'Elevage (AE) s'est déroulée du 1^{er} au 5 octobre 2013 à Ouallam. L'objectif de cette formation est de renforcer les connaissances des AE sur les principales maladies des animaux domestiques. Une deuxième session de recyclage des AE s'est tenue du 10 au 14 décembre 2013 à Ouallam pour renforcer les connaissances des AE sur les techniques de vaccination. A l'issue de ces deux sessions de recyclage, 27 AE ont été formés sur les 30 AE mis en place.

Activité 1.1.c : Appui aux banques d'aliments pour bétail

Dans le cadre de l'appui aux cinq (5) banques d'aliments pour bétail mises en place par le projet, VSF a procédé au recyclage des 25 femmes membres des comités de gestion des banques de soudure sur le thème de « gestion des BAB ». Un processus de réapprovisionnement des BAB a été également conduit. Ce processus a consisté à tenir des réunions avec les comités de gestion de toutes les BAB pour faire le point de leurs stocks et de leurs caisses. Des discussions ont été alors engagées avec le Service Départemental de l'élevage pour un réapprovisionnement des BAB sur leur stock d'aliments pour bétail. Les Banques se sont également réapprovisionnées sur le marché concernant le son de blé. L'objectif est de permettre aux BAB de disposer de stocks qu'elles vont ouvrir à la vente lors de la prochaine soudure pastorale. Les tableaux suivants donnent la situation des stocks et des soldes des 5 BAB.

Tableau 3 : Situation des stocks

Type d'intrant	Ouallam	Simiri	Tondikiwindi	Dingazi	Banibangou
Son de blé (tonnes)	2	1	1	1	2,5
Tourteaux de coton (tonnes)	5	4	2	4	1,5
Total (tonnes)	7	5	3	5	4

Les BAB de Tondikiwindi et Banibangou, présentent des niveaux de stock les plus faibles et des soldes plus importants en banque. Ceci est du à la quasi absence d'offre d'aliment bétail entre fin Novembre et début décembre sur le marché. Ces COGES maîtrisent néanmoins le processus d'approvisionnement et pourrons renforcer leur stocks dans les prochains jours.

Tableau 4 : Situation des soldes

Solde Bancaire	Ouallam	Simiri	Tondikiwindi	Dingazi	Banibangou
FCFA	137 120	30 240	408 930	174 230	257 500

Dans le cadre de la sécurisation des fonds issus des ventes du stock initial, VSF a appuyé les comités de gestion des BAB pour l'ouverture de comptes courants à ECOBANK. Ces derniers se plaignent des agios perçus par la banque sur leurs dépôts. Le projet a alors demandé à l'opérateur VSF de transférer les dépôts des BAB sur des comptes d'épargne. Le processus de changement des comptes courant des BAB en compte épargne est en cours.

2.1.2 Sous composante Extension du système de banques villageoises de soudure

***Rappels :** Cette sous composante est mise en œuvre dans le cadre d'un contrat signé avec l'ONG Africare pour la mise en place et la formation des comités de gestion de 45 banques de soudure construits par le projet, équipés et dotés de 450 tonnes de mil.*

Au cours de l'année 2012, 45 comités de gestion ont été mis en place et 135 femmes membres de ces comités de gestion et 45 encadreurs ont été formés à la « cession et au recouvrement des stocks ». Tout le stock de vivres des 45 banques de soudure a été distribué au cours du mois d'août 2012 et 3484 ménages ont bénéficié de cette distribution. Le recouvrement du stock a débuté après les récoltes et s'est poursuivi jusqu'au premier trimestre 2013.

Les stocks recouverts par les banques de soudure ont été de nouveau distribués en trois cessions au cours des mois de juillet, août et septembre 2013 et le recouvrement est en cours.

Activité 1.2.a: Former les comités de gestion des banques de soudure

La mauvaise gestion des cessions et des recouvrements passés ont démontré que des efforts doivent être menés pour garantir la bonne maîtrise des outils de gestion comme les cahiers de cession, recouvrement et stock par les comités de gestion des banques. L'ONG Africare a

organisé des formations/recyclages in situ lors des visites de suivi et lors des séances de sessions. Il s'agit selon l'ONG de renforcer prioritairement les capacités des secrétaires, des encadreurs et aussi des trésoriers à la tenue des outils de gestion, vu le dysfonctionnement de certains comités, liés surtout au niveau d'instruction des membres.

Activité 1.2.b: Assurer le suivi, l'appui conseil et la supervision des banques

- **Mission de supervision de la DAC/POR/MAG :**

Du 09 au 17 mai 2013, une mission de la Direction des Actions Coopératives et de la Promotion des Organisations Rurales du Ministère de l'Agriculture (DAC/POR/MAG) s'est rendue dans 24 villages d'intervention du PUSA2 afin d'apprécier l'état de fonctionnalité des banques de soudure mises en place et encadrées par l'ONG Africare. Cette mission a constaté la présence physique des stocks au niveau des différentes banques de soudure et recommandé le recyclage des membres des comités de gestion à l'utilisation des outils de gestion et l'implication des communes au suivi des banques de soudure.

- **Mission conjointe PUSA2-Africare-DACPOR/MAG**

Une mission conjointe PUSA2/Africare/DACPOR, d'information/sensibilisation a été conduite du 11 au 16 juin 2013 au niveau de 24 villages d'intervention du PUSA2. Au cours de cette mission, les points suivants ont été abordés avec les membres des comités de gestion des banques de soudure :

- La stratégie des Banques de Soudure et sa logique par rapport au contexte d'urgence,
- Le Rôle et la responsabilité de chaque partie prenante (Africare, PUSA2, Ministère de l'Agriculture) par rapport à la mise en œuvre des activités du projet ;
- Les perspectives de gestion future des banques de soudure.

Concernant la gestion des banques de soudure après le projet, la mission a constaté que la plupart des villages visités préfèrent continuer les prêts du mil en nature car c'est la meilleure façon selon eux d'aider les populations démunies pendant la période de soudure.

- **Enquête d'autorecensement au niveau des villages bénéficiaires du PUSA2**

Une Enquête d'autorecensement des ménages a été conduite par l'opérateur Africare suivant l'approche du projet PPILDA au niveau de 11 villages sur les 45 villages bénéficiaires du PUSA2, soit 24%. Cette enquête a été réalisée en avril 2013, soit près d'une année après les interventions du projet. Elle a permis de mesurer les premiers effets des interventions du projet sur le niveau de vulnérabilité des ménages. Ce niveau de vulnérabilité qui a été mesuré à l'aide de deux critères principaux, à savoir « le capital bétail » et « le nombre de mois de sécurité alimentaire », a en effet diminué avec la distribution des animaux et la mise en place des banques de soudure.

2.2 Composante 2 : Renforcement des systèmes de production de riz irrigué

2.2.1 Sous composante Réhabilitation de périmètres irrigués

Cette composante vise principalement à accroître de manière durable la production de riz irrigué dans la région de Tillabéry, le long de la vallée du Niger. Cet objectif sera atteint par le biais de la remise en état tant physique qu'institutionnelle de quatre (4) périmètres dégradés ainsi que le renouvellement du matériel génétique à l'aide du système de multiplication et de distribution des semences des coopératives.

Activité 2.1.a : Réhabiliter les AHA

- Achèvement des travaux de réhabilitation de l'AHA de Kourani Baria

Le périmètre de Kourani Baria (693 ha), situé dans la commune rurale de Kourtey (région de Tillabéri) comporte deux aménagements réalisés il y a plus de deux décennies et exploités par environ 1470 irrigants regroupés en 2 coopératives. La réhabilitation de l'aménagement hydro agricole de Kourani Baria a pour objectif, de sécuriser l'irrigation pour deux campagnes par an sur ce périmètre et augmenter les rendements de manière significative. Les travaux de réhabilitation ont consisté à :

- La réhabilitation du réseau d'irrigation, de la digue, du réseau de pistes, du réseau de colature, des deux stations de pompage ;
- La construction d'une station de drainage et la mise en place d'un clapet anti retour ;
- La réfection des bâtiments et ouvrages de service ;
- Le traitement de deux Koris ;
- L'aménagement des zones de déversement des koris et d'un site maraîcher.

Les travaux exécutés par l'Entreprise DKO ont démarré le 08 mars 2012 et se sont déroulées sans interruption des campagnes irriguées. La réception provisoire des travaux a été prononcée le 18 Avril 2013. Dans le cadre de la levée des réserves émises lors de cette réception, l'Entreprise a repris les travaux sur le chantier le 25 juin 2013 et a exécuté des travaux sur les canaux (reprise de joints et traitement de fissure), au niveau de la nouvelle station de drainage (péret maçonné) et au niveau d'un kori (travaux de gabionnage complémentaire).

- Réhabilitation de l'AHA de Sona Lossa Kokomani

Le périmètre de Sona Lossa Kokomani (380 ha), également situé dans la commune rurale de Kourtey comporte trois aménagements réalisés en 1974 et exploités par un millier d'irrigants provenant de dix villages regroupés en 3 coopératives. Ce périmètre dont la production a subi une baisse continue au cours de ces dernières années du fait de l'insuffisance de l'eau d'irrigation et la dégradation des infrastructures sera réhabilité par l'exécution des travaux suivants :

- ✓ La construction de 4 nouvelles stations de pompage situées sur le bras principal du fleuve Niger pour régler définitivement le problème d'alimentation en eau des périmètres ;
- ✓ Le renouvellement des conduites et des équipements hydromécaniques dégradés ;
- ✓ La remise en état des digues de protection, des pistes ;
- ✓ Le traitement des Koris contribuant à l'ensablement du périmètre ;

✓ *Le traitement du bassin versant par la réalisation d'ouvrages CES/DRS.*

Les études d'avant projet détaillé (APD) des travaux de réhabilitation ont été effectués par le bureau d'études BETICO. A la suite d'un appel d'offres, quatre lots de marché ont été attribués aux entreprises Moussa Wazir (lot1, lot2, lot3) et Morey (lot4). Le lot4 est relatif au traitement de 4 Koris menaçant les périmètres par la construction de seuils en gabions. Les lot1, lot2, lot3 portent sur la réhabilitation du périmètre. La durée des travaux prévue est de 8 mois dont 6 mois pour le lot4. Le contrôle des travaux est assuré par le bureau BETICO et la supervision par la DGGR.

Le 21 février, le site a été officiellement remis aux entreprises adjudicatrices et un ordre de service en date du 25 mars 2013 leur a été donné. Comme à Kourani Baria, les travaux ont démarré avec l'objectif de minimiser les impacts sur la campagne rizicole.

Concernant le lot4 exécuté par l'Entreprise Morey, les travaux de traitement des koris ont été exécutés avant les termes du délai et la réception provisoire de ces travaux a été faite le 29 juillet 2013. Au cours de cette réception, il a été demandé à l'entreprise de procéder aux corrections qui s'imposent pour apporter plus de soins à la finition des ouvrages.

Par contre, les travaux au niveau des lots 1, 2 et 3 exécutés par l'entreprise M.Wazir accusent un retard par rapport au planning prévisionnel. Suite à ce retard, le PUSA2 en rapport avec la Direction Générale du Génie Rural et le Cabinet contrôle a notifié à l'entreprise ses inquiétudes sur l'achèvement des travaux dans les délais. Après une interruption des travaux du fait de la non accessibilité du périmètre suite aux inondations occasionnées par les pluies, un planning d'urgence a été élaboré et il a été demandé à l'Entreprise de mobiliser impérativement tous les moyens matériels et humains nécessaires pour exécuter ce planning d'urgence. Cependant le rythme actuel des travaux, malgré une pression accentuée du contrôle et de la supervision, ne permet pas de réceptionner les travaux en fin janvier comme prévu par le planning. Il a été demandé à l'entreprise de soumettre un nouveau planning avec une date de réception provisoire ne dépassant pas le 15 février 2014.

Activité 2.1.b : Le suivi contrôle des travaux

Le suivi contrôle des travaux de réhabilitation du périmètre de Sona/Lossa/Kokomani a été assuré par le bureau BETICO sur la base d'un premier contrat de 4 mois géré par le PDREGDE. Un avenant à ce contrat pour une durée de 4 autres mois (pour le restant des travaux) est géré par le PUSA2.

Activité 2.1.c : Superviser les travaux de réhabilitation

La supervision des travaux à Sona/Lossa/Kokomani est assuré par la Direction Générale du Génie Rural (DGGR). Dans la perspective d'une finalisation des travaux dans les délais, un dispositif de supervision a été mis en place par la DGGR et se présente comme suit :

- L'organisation de missions hebdomadaires de supervision assurées par les services régionales du Génie Rural ainsi que la DDGR de Tillabéri.
- L'organisation de missions, toutes les deux (2) semaines par la DGGR au niveau national, missions qui doivent coïncider avec les réunions de chantier.
- La mise en place de deux (2) agents permanents sur le chantier dont l'un pour les travaux au niveau du périmètre et l'autre pour les travaux de traitement des Koris.

Activité 2.1.d : Traiter le bassin versant de Sona Lossa Kokomani

Dans le cadre de la protection du périmètre de Sona Lossa Kokomani, des travaux de traitement du bassin versant de ces aménagements sont en cours de réalisation par les populations locales (hommes et femmes) sous forme de « cash for work ». Les populations sont encadrées techniquement par le consortium d'ONGs CDR et ONDERNA, prestataires retenus après un processus compétitif. Des ouvrages (demi-lunes sur les glacis et cordons de pierres sur les terres dunaires) sont réalisés ainsi que des plantations sous forme d'agroforesterie.

Les activités suivantes ont été réalisées :

- **Prise de contact avec les autorités administratives et coutumières** : Il s'agissait d'informer les autorités Régionales et Préfectorales (Gouverneur, Chefs de cantons, Préfet de Tillabéri ainsi que le maire de Sansané Haoussa) du démarrage du projet;
- **Sensibilisation, information de bénéficiaires sur le projet** : Cette activité a permis de relever le niveau de prise de conscience des populations, ainsi que leurs aptitudes dans la conduite des activités.
- **Formation des membres du comité spécialisé de gestion du site en vie associative et en gestion** : Cette formation visait le développement des compétences locales en matière de gestion durable des ressources naturelles et de protection des bassins versants des périmètres.
- **Formation des encadreurs, les chefs des chantiers et la population en générale pour la conduite des travaux de confection des ouvrages** : Cette formation a permis une maîtrise locale de différentes techniques de confection des ouvrages.
- **Confection des ouvrages** : Les travaux de confection des ouvrages ont démarré donc le 12 Août 2013 avec des séances de démonstration. Ainsi, **1150 ha** de terres ont été traitées par la réalisation de deux types d'ouvrages notamment les cordons de pierres (850 ha) et les demi lunes (300 ha).
- **Plantation** : Environ 11360 plants ont été plantés sur une superficie totale de 72 ha de demi lunes.
- **Participation** : Environ 1880 personnes dont 1316 femmes ont participé à la confection des cordons de pierres et 1027 personnes dont 782 femmes ont participé à la réalisation des demi lunes. Au total, plus de 530 ménages ont participé aux travaux.

Activité 2.1.e : Superviser les travaux de traitement du bassin versant

La supervision technique des travaux de traitement du bassin versant a été assurée par la Direction Régionale de l'Environnement de Tillabéri. Le projet a mis les moyens à la disposition de cette Direction pour assurer la supervision au cours des travaux.

Activité 2.1.f : Organiser des missions de surveillance environnementale

Dans le cadre de la surveillance environnementale des travaux de réhabilitation du périmètre de Sona/Lossa/Kokomani, le projet a financé une mission du BEEEI sur le chantier afin de s'assurer de la mise en œuvre des mesures environnementales prévues dans le PGES de chantier. Cette mission a constaté une mise en œuvre timide du PGES de chantier et a recommandé la prise de dispositions pour une meilleure prise en compte des préoccupations environnementales et sociales.

C'est ainsi que, Dans le cadre de la mise en œuvre du PGES du chantier de SLK, une formation sur le PGES a été organisée par l'environnementaliste de l'Entreprise au bénéfice du personnel de chantier et des membres du comité de gestion. Une autre formation a été réalisée sur l'hygiène au niveau du chantier.

2.2.2 Sous composante Appui à l'ONAHA

Activité 2.2.a : Elaborer et valider le plan d'action de restructuration

Un des objectifs assignés au PUSA2 est le financement d'une étude de restructuration de l'Office National des Aménagements Hydro agricoles (ONAHA). En effet, depuis 1990 et en dépit de sa place centrale dans la mise en œuvre de l'irrigation au Niger, l'ONAHA est confronté à des difficultés financières qui n'ont cessé de s'aggraver du fait, notamment des effets conjugués de la crise économique et de la faible gouvernance qui a caractérisé la gestion de l'établissement pendant de nombreuses années.

Une étude de restructuration de l'office a été ainsi engagée par le PUSA2 au cours des mois d'avril et mai 2013. Cette étude a démarré le 08 avril 2013 et a été conduite par trois Experts dont : un (1) Institutionnaliste qui est également le chef de mission ; un (1) spécialiste de l'irrigation ; un (1) Agronome spécialiste de la mise en valeur.

L'étude de restructuration s'est étalée sur quarante cinq (45) jours. Elle a été abordée par l'Equipe d'experts en deux phases:

- Une première phase de diagnostic durant laquelle il a été possible d'établir l'état des lieux avec une analyse de l'évolution de la situation de l'ONAHA ;
- Une deuxième phase relative à l'élaboration d'un plan de restructuration de l'ONAHA.

Pour mener ces travaux (investigation, diagnostic, analyse de la problématique et formulation du plan d'action), l'Equipe d'Experts a adopté une démarche participative où l'ensemble des acteurs concernés par les aménagements hydro-agricoles ont été consultés et écoutés. On note les étapes suivantes :

- Des entretiens avec les principaux responsables de l'ONAHA et du Ministère de l'Agriculture ainsi qu'avec les représentants des principaux partenaires de l'office ;
- Des visites de certains aménagements hydro-agricoles pour observer leur état et écouter les Services régionaux, les Directeurs des périmètres de l'ONAHA et les représentants des Coopératives.
- Des mini-ateliers d'écoute et d'analyse à caractère participatif organisés sous forme de séances de travail interactives avec les représentants des Coopératives et de l'ONAHA dans les régions.
- Deux (2) ateliers de réflexion organisés à Niamey avec la participation de tous les acteurs.

Ceci a permis à l'Equipe d'experts de retracer les grandes étapes de l'histoire de l'ONAHA avec les réussites et les échecs et identifier les principales difficultés auxquelles l'Office est confronté.

Selon la conclusion de cette étude, l'ONAHA pourrait être un outil privilégié s'il se reconvertit en réajustant ses missions pour mieux répondre aux nouveaux objectifs de l'Etat qui découlent naturellement des enjeux et des défis à relever dont entre autres l'Initiative «3N» et le grand projet du barrage de Kandadji.

Dans cette perspective et pour répondre à ces objectifs de «coordination, planification, encadrement et pilotage des programmes de développement de l'Agriculture irriguée», l'ONAHA sera appelé à travailler, durant les prochaines années, prioritairement sur les axes suivants :

- Procéder au repositionnement institutionnel de l'ONAHA ;
- Élargir l'espace d'intervention de l'ONAHA ;

- Recentrer les missions de l'ONAHA par rapport au nouveau contexte ;
- Adapter l'organisation structurelle de l'ONAHA ;
- S'ouvrir sur l'environnement et développer des relations Partenariales avec les acteurs potentiels ;
- Redimensionner le personnel de l'Office ;
- Innover dans le mode de Gouvernance (Partage des rôles, planification prévisionnelle et outils de gestion appropriés) ;
- Maintenir la forme juridique et changer la dénomination de l'Office.

Un plan de restructuration (plan, chronogramme, budget) a été proposé par les consultants et un atelier de validation de l'étude sur la restructuration de l'ONAHA a été organisé du 23 au 24 octobre 2013, à Niamey.

Activité 2.2.b : Appuyer l'ONAHA pour le suivi de la mise en valeur des périmètres

L'ONAHA assure l'appui à la mise en valeur efficiente des périmètres et le suivi des résultats culturaux (rendements, productions) dans le cadre d'une convention de partenariat avec le PUSA2. Le suivi des activités de production est assuré par le Service Régional et la Direction Générale de l'ONAHA.

Les efforts conjugués des projets (PUSA2, PPAO, etc.), de l'ONAHA, de l'Etat et des autres partenaires dans le cadre de la réhabilitation des périmètres, l'approvisionnement en semences améliorées et en engrais ainsi que la sensibilisation des producteurs ont permis aux paysans d'accroître le rendement du riz sur les AHA qui passe de 4,36 t/ha en SS 2010 à 7,14 t/ha en SS 2013. Cependant l'écoulement de la production a été une énorme contrainte. Le taux de récupération de la redevance est en cours d'amélioration avec la poursuite des récupérations en nature et en espèce suivant un délai de remboursement sous peine de sanction.

Les inondations survenues au cours de la SH 2013 ont occasionné de nombreuses pertes en superficies. En SH la moyenne des rendements est de 5,39 T/ha. La diminution du rendement en SH est liée à plusieurs facteurs dont entres autres le manque d'engrais au niveau de la CAIMA, certains périmètres ont accusé un retard de plus de deux mois.

Tableau 5 : Situation de la production de riz

Régions	Production réalisée en SS 13		Production réalisée en SH 13			Total Superficie Riziculture	Production rizicole	
	Superf réalisées	Rendt	Production réalisée	Superf réalisées	Rendt			Production réalisée
Niamey	2879,095	6,97	20 067,29	1815,68	4,57	8 297,66	4694,775	28 364,95
Tillabéry	3089,03	7,31	22 580,81	3707,8	5,72	21 208,62	6796,83	43 789,43
Dosso	18,74	6,67	125,00	29	5,6	162,40	47,74	287,40
Tahoua	0	0	0	3	2,4	7,20	3	7,20
Diffa	0	0,00	0,00	183,2	6,715	1 230,19	183,2	1 230,19
Total	5986,865	7,14	42 773,10	5738,68	5,39	30 906,06	11725,545	73 679,16

Concernant les périmètres bénéficiaires du PUSA2, plus de 30 hectares de superficies repiquées ont été inondées du fait des pluies pendant la campagne SH 2013. Le rendement

moyen sur ces périmètres a chuté de 6,55 t/ha à la SS 2013 à 5,71 t/ha à la SH 2013 du fait du retard dans l'approvisionnement en engrais au cours de cette dernière campagne. La récupération de la redevance est en cours pour la campagne SH2013, le taux de récupération pour la campagne SS 2013 est d'environ 98,22%.

Tableau 6 : Situation sur les périmètres bénéficiaires du PUSA2

AHA	Superficies Repiquées en SH 2013 (ha)	Rendements obtenus en SH 2013 (t/ha)	Taux de récupération redevance SS 2013 (%)
Kourani Baria I	390,77	5,84	99,40
Kourani Baria II	255,28	5,43	100,00
Kokomani	49,75	6,13	100,00
Lossa	143,94	5,58	93,02
Sona	149	5,56	98,67
TOTAL/MOYENNE	988,74	5,71	98,22

2.2.3 Sous composante Soutien au système de multiplication et de distribution des semences des coopératives

L'INRAN, la FUCOPRI et la ferme semencière de Saadia sont les principaux acteurs dans le cadre de la mise en œuvre des activités de cette sous composante. Une convention a été signée avec l'INRAN/FUCOPRI pour l'appui à la production des semences.

Au cours de la campagne saison sèche 2013, une production de semences R1 a été engagée au niveau de la ferme de Saadia avec des semences G4 fournies par le projet TRAGSA. Pour améliorer la visibilité de la ferme et contribuer à rétablir la confiance entre la ferme et les coopératives, le PUSA2 a appuyé la FUCOPRI pour l'organisation d'une mission d'information et sensibilisation auprès de 34 coopératives (du 16 mai au 06 juin 2013) mais également pour l'organisation de visites guidées à la ferme semencière de Saadia (le 14 avril et le 12 mai 2013). Ces deux activités ont permis :

- de sensibiliser les producteurs sur l'utilisation de semences de qualité provenant de la ferme ;
- aux responsables des coopératives d'apprécier sur le champ et à deux stades différents (épiaison, maturité) la qualité du riz produit à la ferme et aux autres partenaires d'accorder plus d'attention aux activités de la ferme.

Ainsi, au cours de la campagne de saison sèche 2013, environ 160 tonnes de riz ont été produites par la ferme et devraient être vendus aux coopératives ou à leurs partenaires.

Cependant, seulement 40 tonnes de semences ont été écoulées auprès des coopératives du fait selon l'ONAHA de l'inondation de certains périmètres. La ferme elle-même, complètement inondée, a perdu la campagne d'hivernage 2013. La ferme a engagé la

campagne SS 2014 mais 40 tonnes de semences produites en SS 2013 restent encore à écouler.

D'autre part, Deux session de formation ont été organisées par le projet en collaboration avec l'INRAN :

- Une formation des encadreurs des aménagements hydro agricoles (AHA) et des agents de l'agriculture en techniques de production, conservation , contrôle et certification de semences de riz. Au total, 20 personnes ont été formées dont 13 agents d'encadrements des AHA et de vulgarisation (dont 5 de Diffa), 4 encadreurs de la zone d'intervention de PUSA 2 et 3 techniciens de recherche. Cette formation s'est déroulée du 13 au 16 Septembre 2013, au CERRA de Kollo
- Une formation sur le « Conditionnement et conservation des semences de riz » a été organisée à Kollo du 27 au 29 décembre 2013 à Kollo. Ainsi 10 paysans multiplicateurs de semences et 5 encadreurs des périmètres ont bénéficié de cette formation.

2.2.4 Sous composante Renforcement des coopératives

Dans le cadre de la mise en œuvre des actions de renforcement des coopératives des 5 périmètres rizicoles qui sont réhabilités par le PUSA2 (Kourani Baria 1 et 2 ; Sona, Lossa et Kokomani), un contrat a été signé avec le Centre de Prestation de Service (CPS) pour la mise en place de mécanismes durables de gestion des ressources des coopératives et de gestion de l'eau.

Activité 2.4.c : Suivre la gestion comptable et la gestion de l'eau des coopératives

➤ **La Gestion Comptable**

Au niveau la gestion comptable et financière des coopératives, quelques progrès ont été réalisés par rapport à la situation avant projet. Des efforts considérables ont été faits dans la tenue et la disponibilité des documents. Cependant, le retard dans la transmission des pièces justificatives aux comptables est toujours d'actualité au niveau de Kokomani, Lossa et Sona. Les coopératives qui ont le plus progressé sont celles des Kourani Baria 1 et 2, des progrès restent à faire au niveau de Sona, Lossa et Kokomani.

Les taux moyens de recouvrement des redevances en SS 2012 et SH 2012 sont respectivement de 97,90% et 98,64%. En SS 2013, le taux est de 98,21%. Pour la SH 2013, les recouvrements sont en cours.

Concernant les dettes, au moment du diagnostic les dettes fournisseurs étaient de 150 539 664 Fcfa. Pour les trois campagnes suivant l'étude, les coopératives ont contracté des nouvelles dettes pour un montant de 478 665 546 Fcfa, donnant une dette globale de 629 205 210 Fcfa sur laquelle 428 179 204 F ont été réglés, soit un taux de 68,05%. A présent, un climat de confiance règne entre les coopératives et leurs fournisseurs.

Tableau 7 : Situation des recouvrements

Coopératives	SS 2012	SH 2012	SS 2013	SH 2013
--------------	---------	---------	---------	---------

Kokomani	99,05%	100,00%	100,00%	En cours
Kourani Baria I	100,00%	99,86%	99,40%	
Kourani Baria II	99,50%	99,92%	100,00%	
Lossa	91,72%	94,60%	93,02%	
Sona	99,19%	98,80%	98,67%	
MOYENNE	97,90%	98,64%	98,21%	

Au nombre des progrès réalisés par rapport à la situation d'avant l'intervention du CPS on note :

- la tenue des documents,
- l'amélioration du taux de recouvrement des créances,
- la maîtrise des créances par campagne,
- l'ouverture et début d'alimentation des comptes en banques,
- la transparence et la dissipation de certaines suspicions des exploitants lors des arrêts des comptes de redevance,
- la prise en compte de toutes les charges et les conseils susceptibles de réduire les charges de la campagne, notamment le respect du calendrier cultural par l'ensemble des exploitants.

➤ La gestion de l'eau

En ce qui concerne la gestion de l'eau, les défis sont :

- le respect du calendrier cultural
- l'instauration du tour d'eau

Au niveau des périmètres, des réunions se sont tenues aux débuts des différentes campagnes et ont permis de programmer les activités liées à la gestion de l'eau, entre autres des travaux d'entretien collectifs et confortatifs, et aussi l'établissement d'un calendrier cultural prévisionnel. A Sona, Lossa et Kokomani, le problème d'eau est souvent la cause du ralentissement des activités (labour, semi ; repiquage). A Kourani Baria, on note le renouvellement des Comités de Gestion de l'eau et une formation pour une mise à niveau sur la gestion de l'eau. On note également le début timide de certaines activités notamment de curage des canaux et l'élagage des arbres.

Selon le CPS, les perspectives sont les suivantes :

- L'instauration effective du tour d'eau après les travaux de réhabilitation ;
- L'application du règlement intérieur de la gestion de l'eau afin d'assurer un entretien des ouvrages et équipements et surtout une meilleure gestion de l'eau au niveau des périmètres.

2.3 Composante 3 : Coordination, gestion et suivi évaluation

Cette composante a pour objectifs la coordination, la gestion des ressources et le suivi évaluation du projet. La coordination est assurée par l'Unité de Coordination Technique et Fiduciaire (UCTF) du PRODEX.

2.3.1 Sous composante Coordination et Gestion du projet

Activité 3.1.e : Réaliser l'audit des comptes du projet ;

Un audit des comptes du PUSA2 a été réalisé au cours du mois de mai 2013 par le cabinet KMC. Cet audit a concerné la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2012 et a porté sur : les processus de gestion des marchés, de la paie, des achats-décaissements, la gestion du carburant, la gestion des missions et le système d'information en général. Les travaux ont principalement porté sur l'appréciation des contrôles mis en œuvre pour assurer une bonne maîtrise des opérations. A l'issue de cet audit, des recommandations ont été faites pour une meilleure gestion financière et comptable du projet.

2.3.2 Sous composante Suivi évaluation

Activité 3.2.e : Organiser les supervisions conjointes

La quatrième mission d'appui de la Banque Mondiale au PUSA2 s'est déroulée entre le 29 mars et le 24 mai 2013 en 2 séquences :

Du 29 mars au 3 avril 2013, pour les aspects recheptelisation, banques de soudure, réhabilitation des aménagements hydro-agricoles, Etude de restructuration de l'ONAHA et les mesures de sauvegardes environnementales et sociales;

- Du 17 au 24 mai 2013 pour les aspects partenariats y compris la production de semences améliorées de riz ainsi que la passation des marchés.

Ainsi, la revue de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation au niveau de Sona/Lossa/Kokomani fait apparaître la nécessité d'un délai supplémentaire de 6 mois pour les terminer, c'est-à-dire allant au-delà de la date de clôture initiale du 29 novembre 2013. Elle a encouragé la partie nationale à introduire une requête de prorogation auprès de la Banque mondiale à cet égard. Cette requête a été introduite.

La cinquième mission d'appui de la Banque Mondiale au PUSA2 s'est également déroulée en 2 séquences : du 30 septembre au 7 octobre 2013 pour les aspects concernant les activités des deux composantes opérationnelles et du 11 au 13 novembre pour les aspects de sauvegardes environnementales et sociales. Cette mission a recommandé la prise des dispositions pour l'accélération des travaux de réhabilitation du périmètre de SLK mais également pour la mise en œuvre effective du PGES de chantier.

III SITUATION FINANCIERE

Au cours du mois de juin, un plan d'action pour une prorogation du projet a été élaboré pour la période allant du 1^{er} juillet 2013 au 30 mai 2014 avec un budget d'un montant de 3 174 594 594 Fcfa. Ce budget comprend toutes les dépenses non encore réalisées du PTBA 2013 avec des réajustements des montants prévus pour certaines activités. En effet, les activités concernant la réhabilitation de SLK vont connaître une extension en 2014. Il s'agit notamment des travaux de réhabilitation, la supervision, le contrôle, le suivi environnemental etc.... Les réajustements effectués ont pris en compte le reliquat de fonds du projet. Les décaissements en faveur du projet depuis la mise en vigueur se présentent comme suit :

Tableau 8 : Demandes de remboursements du projet

Numéro	Type de demande	Montant (Fcfa)	Date de paiement
1	DRF	300 000 000	24 août 2011
2	DRF	70 354 491	18 août 2011
3	DRF	52 633 877	19 décembre 2011
4	DRF	56 688 449	14 février 2012
5	DRF	103 161 548	13 mars 2012
6	DPD	433 407 089	13 mars 2012
7	DRF	103 627 524	02 avril 2012
8	DRF	89 935 340	09 mai 2012
9	DRF	186 866 205	18 mai 2012
10	DRF	108 053 256	06 juin 2012
11	DPD	324 130 959	13 juin 2012
12	DRF	109 802 666	07 août 2012
13	DRF	150 329 566	20 août 2012
14	DPD	430 957 761	24 août 2012
15	DRF	136 272 513	24 septembre 2012
16	DRF	222 812 663	06 novembre 2012
17	DRF	134 617 748	12 février 2013
18	DPD	551 480 060	08 février 2013
19	DPD	74 970 400	20 mars 2013
20	DPD	611 128 903	20 mars 2013
21	DRF	215 503 669	18 Avril 2013
22	DPD	123 025 161	30 Avril 2013
23	DPD	161 955 050	16 Juillet 2013
24	DRF	84 442 589	16 Juillet 2013
25	DPD	91 333 350	30 Août 2013
26	DPD	107 293 062	18 Septembre 2013
27	DPD	943 376 718	05 novembre 2013
28	DRF	255 919 652	13 novembre 2013
TOTAL		6 234 080 269	

Tableau 9 : Exécution financière du PTBA 2013 au 31/12/2013

Composantes	Budget total	Prévision par bailleur		Réalisation par bailleur		Taux %
		IDA	Bénéf	IDA	Bénéf	
Restauration du capital productif des ménages ruraux en situation d'insécurité alimentaire	68 163 655	68 163 655	0	14 385 319	0	21,10
Renforcement du système de production de riz irrigué	4 666 794 306	4 666 794 306	0	3 276 821 035	0	70,22
Gestion, Coordination et Suivi & Evaluation du Projet	132 974 069	132 974 069	0	53 521 796	0	40,25
TOTAL	4 867 932 030	4 867 932 030	0	3 344 728 150	0	68,71

Commentaire analytique : Le taux d'exécution financière du PTBA 2013 est de 68,71 % au 31 Décembre 2013.

Tableau 10 : Exécution budgétaire du PTBA 2013 au 31/12/2013

Composantes	Budget total	Prévision 2013	Réalizations			Taux de réalisation
			Réalisation 2013	Engagement fermes	Total réalisation	
Restauration du capital productif des ménages ruraux en situation d'insécurité alimentaire	1 115 090 481	68 163 655	14 385 319	50 637 281	65 022 600	95,39
Renforcement du système de production de riz irrigué	3 485 359 494	4 666 794 306	3 276 821 035	0	3 276 821 035	70,22
Gestion, Coordination et Suivi & Evaluation du Projet	230 183 284	132 974 069	53 521 796	0	53 521 796	40,25
TOTAL	4 830 633 259	4 867 932 030	3 344 728 150		3 395 365 431	69,75

Commentaire : Le taux d'exécution budgétaire du PTBA 2013 est de 69,75% au 31 décembre 2013.

Tableau 11 : Situation cumulée du décaissement par catégories de dépenses sur le fonds IDA au 31/12/2013 (Source client connection) Banque Mondiale

Catégories	Montant alloué (FCFA)	Montant décaissé (FCFA)	Non décaissé (FCFA)
1. Restauration du capital productif des ménages ruraux en situation d'insécurité	1 070 723 176	1 002 961 904	67 861 272
2. Renforcement du système de production de riz irrigué	5 749 384 332	4 366 625 946	1 382 758 386
3. Gestion, Coordination et Suivi & Evaluation du Projet	366 622 907	308 515 231	58 107 676
DA-A		287 481 487	-287 481 487
TOTAL	7 186 730 415	5 965 484 568	1 221 245 847

Commentaire analytique : Le taux de décaissement est de 83,01 % au 31 Décembre 2013.

IV PERSPECTIVES

Une seule perspective majeure demeure pour le projet, c'est la finalisation des travaux de réhabilitation du périmètre de Sona, Lossa, Kokomani concernant les lots 1, 2, 3. Pour cela l'intensification du suivi sera maintenue pour que la réception des travaux se fasse en février 2014. Le deuxième aspect important est relatif à la préparation du rapport d'achèvement du projet.

Annexe 1 : Réalisations financières par composantes

Composante 1: Restauration du capital productif pour les ménages ruraux en insécurité alimentaire

Sous Composante	Activités	Prévisions physiques	Réalisations physiques	%	Prévisions financières (Fcf)	Réalisations financières (Fcf)	%	Observations
Sous Composante 1.1 : Recapitalisation du cheptel	Résultat 1.1.1: Le capital bétail des ménages vulnérables est sécurisé par un meilleur accès aux services de santé et de production animale							
	Mise en œuvre convention consortium VSF/Karkara/CESAO	1 avenant	1 avenant	100	9 185 400	0	0	
	Acquérir les animaux	200 chèvres	200 chèvres	100	5 000 000	4 308 521	86	
	Superviser la prestation	3 missions	1	50	1 500 000	600 518	40	
	Sous total1				15 685 400	4 909 039	31	
Sous composante 1.2: Extension du système de banques villageoises de soudure	Résultat 1.2.1: Les banques de soudure sont gérées durablement							
	Réceptionner les banques de soudure et BAB	Retenu de garantie	0	0	3 590 283	0	0	
	Mettre en place et former les comités de gestion des banques de soudure	1 contrat	1 contrat	100	45 387 972	5 673 496	12	
	Superviser/Réception travaux	1 mission	1 mission	100	2 000 000	2 312 668	116	
	Superviser les BS	3 missions	2 missions	66,66	1 500 000	1 490 116	99	
Sous total2				52 478 255	9 476 280	18		
TOTAL COMPOSANTE 1					68 163 655	14 385 319	21	

Composante 2 : Renforcement des systèmes de production de riz irrigué

Sous Composante	Activités	Prévisions	Réalisations	%	Prévisions	Réalisations	%	Observations	
		physiques	physiques		financières (Fcf)	financières (Fcf)			
Résultat 2.1.1 : les AHA de Kourani Barla , Sona , Lossa et Kokomani sont réhabilités									
Sous composante 2.1: Réhabilitation de périmètres irrigués	Réhabiliter l'AHA de Kourani Baria	693 ha	694 ha	100	887 487 727	828 342 325	93,34		
	Réhabiliter l'AHA de Sona Lossa Kokomani	Aménag 380 ha	en cours	-	3 055 644 515	1 873 540 333	61,31		
		Trait 4 Koris	Trait 4 Koris	100	374 852 000	364 732 000	97,30		
	Superviser les travaux de réhabilitation de SLK	Convention	Convention	-	6 500 000	4 279 296	65,84		
	Résultat 2.1.2 : le bassin versant des AHA de Sona Lossa et Kokomani est traité								
	Traiter le bassin versant de l'AHA de Sona Lossa Kokomani	1115 ha	1116 ha	100	189 476 195	91 330 399	48,20		
	Superviser les travaux de traitement du bassin versant SLK	Convention	En cours	-	2 560 335	377 740	14,75		
	Résultat 2.1.3 : Le suivi environnemental des périmètres et la formation des producteurs sont assurés								
	Surveillance environnementale	Convention	En cours	-	8 000 000	1 333 508	16,67		
	Etude Bras mort SLK	1Etude	1Etude	100	12 500 000	11 190 000	89,52		
Former les responsables des coopératives et les DP sur la gestion des pesticides	1 session	1 session	100	5 000 000	3 309 284	66,19			

	Former et équiper les brigadiers phytosanitaires	1 session	0	0	6 000 000	0	0,00	
	Sous total 1				4 548 020 772	3 178 434 885	69,89	
Sous composante 2.2 : Appui à l'ONAHA	Elaborer le plan d'action de restructuration	1 plan	1 plan	100	38 000 000	54 690 190	143,92	
	Appuyer l'ONAHA pour le suivi de la mise en valeur des périmètres	1 contrat	1 contrat	100	7 172 130	7 172 130	100,00	
	Sous total 2				45 172 130	61 862 320	136,95	
Sous composante 2.3 : Soutien au système de multiplication et de distribution des semences des coopératives	Produire les semences et renforcer la capacité des acteurs (INRAN/FUCOPRI)	1 contrat	1 contrat en cours	-	52 961 740	15 928 830	30,08	
	Sous total 3				52 961 740	15 928 830	30,08	
Sous composante 2.4 : Renforcement des coopératives	Renforcer les capacités des coopératives	1 contrat	1 contrat en cours	-	20 639 664	20 595 000	99,78	
	Sous total 4				20 639 664	20 595 000	99,78	
	TOTAL COMPOSANTE 2				4 666 794 306	3 276 821 035	70,22	

Composante 3 : Gestion Coordination et Suivi évaluation

Activités	Indicateurs de réalisation	Montant prévu (FCFA)	Montant réalisé (FCFA)	%	Observations
Fonctionnement	Charges de fonctionnement	18 760 000	13 757 747	73	
Charges du personnel (Salaires)	2 cadres et 2 auxiliaires pris en charge	31 081 284	26 937 469	87	
Equipement		1 700 000	0	0	
Formations et ateliers	1 cadre formé; 2 réunions du comité de pilotage	31 132 785	0	0	
Supervisions ,Etudes, communication	Supervisions internes; Supervisions Ministère; Communication; Rapport d'achèvement	32 000 000	6 504 580	20	
Services consultants	Audit financier	18 300 000	6 322 000	35	
		132 974 069	53 521 796	40	

Annexe 2 : Suivi des indicateurs de performance

Indicateurs des résultats	Référence 2010	Valeurs cibles			Niveau cible au 31 décembre 2013	Réalisations au 31 décembre 2013	% Réalisations	Observations
		Année 1	Année 2	Année 3				
180 000 personnes sont bénéficiaires directes du projet, dont 30% de femmes	0	48 000 30 %	150 000 30 %	180 000 30 %	180 000 dont au moins 54 000 femmes	79140 dont au moins 40300 femmes	43,96	
54 000 personnes par le biais de la restauration des biens de production	0	39 000	49 000	54 000	54 000	54 530	101	Il s'agit des membres de 5600 ménages bénéficiaires de la distribution de petits ruminants et de 3484 ménages bénéficiaires de la distribution des vivres.
126 000 personnes par le biais de la production de riz irrigué	0	9 000	100 800	126 000	126 000	24610	19,53	Il s'agit de 19754 personnes bénéficiaires de la réhabilitation des périmètres et 4856 personnes bénéficiaires de cash for work dans le cadre des traitements de bassins versants
Le rendement de riz des producteurs bénéficiant du soutien du projet est de 5,5 tonnes/ha	4,3	4,3	5,0	5,5	5,5	5,63*	102,36	Il s'agit de la moyenne de rendement enregistrée à KB pendant la campagne SH 2013. Les rendements pour la variété Gambiaca sur ce périmètre a varié entre 7,5 et 8 t/ha
La production de riz dans les zones cibles est de 85 800 tonnes par an	55 800	50 000	70 000	85 800	85 800	73 679,16*	85,87	Il s'agit du niveau de production après les deux campagnes 2013. Les inondations enregistrées à la campagne SH 2013, n'ont pas permis d'atteindre la production de 100 000 tonnes attendue par ONAHA.
Indicateurs des résultats Intermédiaires								
17000 petits ruminants distribués aux foyers cibles	0	15 000	17 000	17 000	17 000	17000	100,00	16800 chèvres distribués en mars, juillet, août et septembre 2012 ; et 200 chèvres

(majorité de femmes vivant dans les zones fortement exposées à l'insécurité alimentaire)								distribuées en décembre 2013
45 banques alimentaires créées en période de soudure pour les bénéficiaires cibles (femmes vivant dans les zones fortement exposées à l'insécurité alimentaire)	0	35	45	45	50	50	100	45 banques de soudure et 5 banques d'aliments bétail ont été construites en matériaux définitifs, équipés et dotés chacune de 10 tonnes de mil par les BS et 10 tonnes de son de blé par BAB.
1073 ha de périmètres irrigués remises en état	0	0	1 073	1 073	1 073	693	64,58	La réhabilitation du périmètre de Kourani Baria (693 ha) est terminée et les travaux de réhabilitation de 380 ha à SLK sont en cours.
8000 ha de superficies cultivées à l'aide de semences améliorées	Moins de 1 000	1 000	6 000	8 000	8 000	5738,68*	71,73	Il s'agit des superficies mises en valeur pendant la campagne SH 2013. En effet, selon l'ONAHA, tous les périmètres ont disposé de semences améliorées dans le cadre du programme d'urgence. Le PUSA2 a contribué pour la SS 2013 pour 20 tonnes de semences R1 Gambiaca.

*Source ONAHA
