


REPUBLIQUE DU NIGER

MINISTERE DE L'AGRICULTURE



Projet de Développement des Exportations
et des Marchés Agro-Sylvo-Pastoraux

BP: 507, Niamey NIGER
TEL. 227 35 00 68 FAX: 227 35 02 93
Email : niger_prodex@yahoo.fr

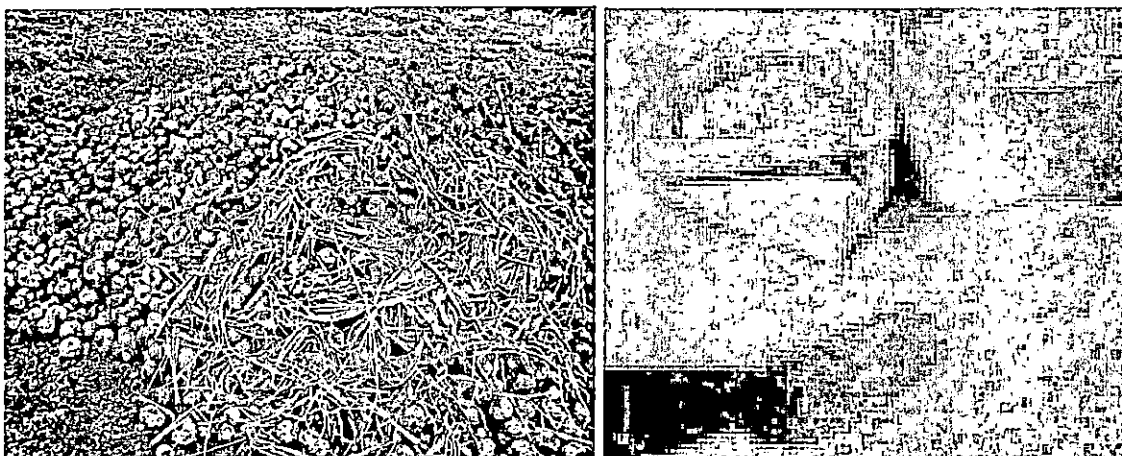

Etat de mise en œuvre du PPTBA 2011 au 30
septembre 2011

Octobre 2011

1. FICHE SIGNALÉTIQUE DU PROJET

- Intitulé : Projet de développement des exportations et des marchés agro sylvo pastoraux
- Tutelle : Ministère de l'Agriculture (MAG)

Libellé	Information
Négociation État du Niger/ BM	Du 04 au 06 février 2009
Accord de crédit N°4552-NF	24 avril 2009
Mise en vigueur	17 Décembre 2009
Date de démarrage	Décembre 2009
Date de clôture	Avril 2014
Financement	43.25 millions \$ US
• IDA	40 millions \$ US
• Gouvernement du Niger	PM
• Bénéficiaires	3.25 millions \$ US
<u>Comité de pilotage</u>	Comité de pilotage du Programme 3 de la SDR (Organisation Professionnelle et Structuration des filières).
Tutelle	Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage
Structure d'exécution	Unité de Coordination Technique et Fiduciaire (UCTF)
<u>Zone d'intervention</u> :	Le Projet a une couverture nationale et intervient plus spécifiquement dans les zones de concentration des filières prioritaires retenues
<u>Objectif de développement</u>	<p>Le projet s'inscrit dans la SDR et contribue à l'atteinte des objectifs du Programme 3 (Organisation Professionnelle et Structuration des filières).</p> <p>L'objectif de développement du projet (ODP) est d'accroître la valeur de certains produits commercialisés par des producteurs soutenus par le projet.</p>
<u>Groupes Cibles</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Les producteurs du secteur agro sylvo pastoral et leurs organisations, • Les PME de transformation, de conditionnement et de commercialisation, • les prestataires de services publics et privés, • les institutions financières.
<u>Le principal domaine d'intervention</u>	Le développement des filières prioritaires afin d'être compétitives sur les marchés régionaux et internationaux. Ces filières concernent : oignon, niébé et bétail/viande, cuirs et peaux, sésame, souchet et gomme arabique et les autres filières émergentes

<u>Stratégie d'intervention</u>	Stratégie opérationnelle : Faire - faire <ul style="list-style-type: none"> • Intervenir au niveau des maillons faibles des filières d'exportation et de mise en marché; • Cibler les petits producteurs en renforçant leur capacité en matière d'innovation technologique pour une production de qualité à l'export ; • Promouvoir les produits d'exportation et améliorer leur compétitivité grâce à des investissements ciblés; • Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles publiques et privées; • Favoriser les initiatives des producteurs (individuels ou en petites entreprises) des exportateurs et opérateurs connexes.
<u>Approche du Projet</u>	<input type="checkbox"/> l'approche chaîne d'approvisionnement (Supply chain) <input type="checkbox"/> le partenariat public privé/ privé- privé

2. ETAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES PAR COMPOSANTE

2.1. Composante A : Amélioration de la coordination des chaînes d'approvisionnement et des conditions de mise en marché

2.1.1. Présentation de la composante

La composante vise à construire un partenariat public-privé en vue de structurer et renforcer la coordination entre les principaux maillons des filières prioritaires retenues. La composante est subdivisée en trois sous composantes :

(a) Appui à la coordination des chaînes d'approvisionnement

Cette sous-composante a pour but de structurer et stimuler la coordination entre les principaux segments dans les filières retenues à savoir : bétail-viande, cuirs et peaux, oignon, niébé, sésame, souchet, et gomme arabique.

(b) Appui aux opérateurs économiques à fort potentiel :

Cette sous-composante vise à renforcer les organisations de producteurs en place (coopératives), et à faciliter l'émergence de nouvelles organisations, afin qu'ensemble elles soient plus compétitives sur les marchés intérieur et international. Pour ce faire, le projet va identifier les opérateurs, renforcer leur capacité technique et managériale, s'assurer qu'ils adoptent des méthodes optimales de production et de transformation, élaborer des plans d'affaires et des sous projets viables, et développer des pratiques commerciales axées sur le marché et fondées sur des contrats.

(c) L'appui à la commercialisation et à la compétitivité :

Cette sous composante a pour objectif de surveiller l'application d'une approche globale de la chaîne de valeur afin d'améliorer la qualité de la production au Niger et sa compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux.

2.1. 2. Bilan de la mise en œuvre des activités

Tableau 1 : Composante A : Amélioration de la coordination des chaînes d'approvisionnement et des conditions de mise en marché

Proposante	Résultats	Activités	Prévisions Physiques	Réalisations Physiques	%	Prévisions Financières	Réalisations Financières	%	Commentaire
	R1A1: La compétitivité des filières est améliorée	Activité 1 : Mener des plaidoyers afin de réduire les tracasseries routières	1	1	100	3 000 000	3 160 000	105	<p>Tenue de réunion avec le RECA, l'ANFO et le FCMN ; Signature d'une convention de partenariat avec USAID/ATP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un appui d'USAID-ATP au PRODEX pour la réduction des tracasseries routières le long des corridors Tsernaoua-Accra et Tsernaoua- Abidjan par le partage d'expériences • la formation de formateurs pour la sensibilisation et le coaching des conducteurs et commerçants d'oignons, ainsi que pour les opérations de plaidoyer ; • Le partage de données statistiques : avec mission du SSE/PRODEX à USAID/ATP Accra • Appui à la réalisation de la table ronde de ANFO sur les tracasseries routières
		Activité 2 : Organiser des missions de prospection commerciales pour les filières oignon et bétail	2	1	50	20 000 000	23 933 750	119	<p>La mission de prospection a été organisé au niveau de 4 pays : Côte d'Ivoire ; Ghana, Bénin et Togo Rapport de mission disponible.</p> <p>Signatures de lettre d'intention avec les</p>

									comptoirs d'Agadez et de Tsernaoua
		Activité 5 : Réaliser les études IES pour la réhabilitation des abattoirs de Tahoua, Maradi et Zinder	1	0	0	15 000 000	0	0	Consultants identifiés pour de l'étude d'impact environnemental et social des projets de réhabilitation des abattoirs frigorifiques de Maradi, Zinder et Tahoua à l'issue d'une manifestation d'intérêt.
		Activité 6: Réaliser l'étude IES sur la création d'une tannerie à Malbaza	1	0	0	5 000 000	0	0	SANS OBJET, l'activité est prise en charge par un autre partenaire technique et financier
		Activité 7 : Actualiser le référentiel technico économique de l'emboche bovine et ovine	1	1	100	3 000 000	310 000	10.3	Le référentiel technico économique de l'emboche bovine et ovine a été élaboré et validé. Les référentiels sont édités
		Activité 8 Elaboration de guides de procédure pour l'organisation de la concertation	1	1	100		PM		Le guide a été élaboré, validé et diffusé.
		Activité 9 Organisation des collèges d'acteurs	3	0	0	15 000 000	42 695 130	285	Le processus est en cours au niveau des agences d'exécution des filières. Au total 15 réunions régionales ont été tenues par les agences d'exécution des filières oignon et BVCP
1 : Amélioration de coordination des chaînes d'approvisionnement des conditions de mise en marché									

		Activité 10 Organisation des forums annuels d'évaluation et de programmation	3	0	0	15 000 000	0	0	Les forums sont prévus en novembre 2011
		Activités 11: Elaborer et valider les plans d'actions des filières sésame, souchet et gomme arabique	3	0	0	12 000 000	0		RAS
	R2-A1 : Les informations sont disponibles sur les prix et les marchés des filières appuyées	Activité 2.1 Evaluer les SIM existants	1	1	100	10 000 000	8 522 791	85	L'étude diagnostique pour et apprécier les SIM existants intervenants dans la collecte des informations sur les prix et les marchés concernant les filières prioritaires a conduite par un consultant et les résultats de l'étude ont été validés. Un plan d'action est élaboré.
		Activité 2: Appuyer les SIM existants	1	0	0	15 000 000	0	0	Les actions prioritaires du plan d'action ont été identifiées et une réunion est prévue avec la SDR pour concrétiser l'appui.
	R3-A1 : Le Certificat " Bons d'enlèvement et de commercialisation " comme outil de commercialisation est appliqué aux produits des filières exportés	Activité 1 : Evaluer les besoins et les contraintes par rapport à la faisabilité technique et institutionnelle	1	0	0	10 000 000	0	0	Le consultant devant conduire l'étude a recruté à l'issue d'une manifestation d'intérêt et le démarrage de l'étude est prévu en fin octobre 2011.
	R4-A1 : La commercialisation et les exportations des	Activité 1: Actualiser les normes de qualité des produits (oignon, niébé et bétail/viande)	1	0		4 000 000	0	0	RAS

	produits des filières prioritaires sont développés	Activité 2: Vulgariser les normes de qualité des produits (oignon, niébé et bétail/viande)	3	0		5 000 000	0	0	RAS
		Activité 3: Diffuser les textes règlementaires en matière de commerce	1	0		5 000 000	0	0	RAS
A2 : A2 Appui aux opérateurs économiques à fort potentiel	R1-A2 : Les plans d'action des filières prioritaires sont mis en œuvre.	Activité 1: Mettre en œuvre les contrats des opérateurs chargés de la mise en œuvre des 3 filières (oignon, niébé et bétail viande, cuirs et peaux)	3	3	100	226 500 000 + 150 000 000 (activité 2)	577 232 626	153	Les trois agences d'exécution sont opérationnelles avec : Mobilisation de leurs personnels (personnel clé des contrats et les coordinations régionales) fonctionnalité des différents bureaux régionaux, mise en œuvre des plans d'action des filières NB : ces montants comprennent les coûts liés à la mise en œuvre de l'activité n°2 A2
		Agence Oignon	1	1	100	350 000 000	96 582 813	27,6	
		Agence Bétail	1	1	100	240 000 000	345129792	143,8	
		Agence niébé	1	0	0	175 000 000	135 520 021	77,4	
		Activité 2: Mettre en œuvre les plans d'actions des filières	3	2		150 000 000			
	R2-A2 : Les prestataires secondaires, les Organisations professionnelles des filières prioritaires et les PME sont identifiés et formés	Activité 1 : Identifier les prestataires secondaires	nd	74		PM	PM		Les trois AGEX ont identifiés leurs prestataires secondaires (cf. listes en annexes) à l'issue des manifestations et des sélections sur la base des dossiers
		Activité 2 : Assurer la mise à niveau des prestataires	Nd	114		Cf. Plan	7 187 500		Les agences d'exécution des filières oignon, niébé et bétail, viande /cuirs et peaux ont renforcés les capacités de leur prestataires secondaires .Ces formations ont touché 114 personnes sur les thèmes : > Montage de dossiers de micro projets des filières

									<ul style="list-style-type: none"> ➤ Le calcul du taux de rentabilité des sous-projets ; ➤ L'élaboration du bordereau des prix des différents articles composant les dossiers des sous-projets; ➤ L'utilisation du GPS et les logiciels de cartographie des sites des sous-projets ; ➤ L'approche filière ou chaîne d'approvisionnement dans l'élaboration des sous-projets.
		Activité 3 : Identifier et diagnostiquer la situation des OPfs et PME des filières prioritaires	3	3	100	Cf. plan d'action			
		Activité 4 : Renforcement les capacités des Organisations Professionnelles des filières et les PME							
		Activité 5: Elaborer des guides de bonnes pratiques (Cuirs et peaux et oignon)	2			8 000 000			RAS
		Activité:8 Participation aux foires, forums, salons, journée oignon, etc.	Ff			50 000 000	35 624 911	66%	Participation à la journée de l'oignon édition 2011 organisée par le RECA (cf. rapport atelier) Participation à un atelier organisé par NESTLE dans le cadre de la filière oignon La participation au salon international de Mekhnès au Maroc avec les représentants de la filière oignon, sésame, le RECA et

									le Ministère de l'Agriculture de l'élevage (2 représentants) et l'UCTF. Participation à la fête de la viande édition 2011
A3 A3 L'appui à la commercialisation et à la compétitivité	R1-A3 : L'appui d'une firme internationale est sollicité pour appuyer le Projet	Activité 1: Mettre en œuvre le contrat avec la firme internationale	1	1	100	100 000 000	194 275 591	194%	Mobilisation du personnel clé prévu dans le cadre du contrat et mise en œuvre des activités d'appui au projet
	R2-A3 : l'offre de semences d'oignon et de niébé est améliorée	Activité 1: Elaborer et mettre en œuvre une convention avec la recherche pour la production des lignées variétales pures	1	1	100	20 000 000		-	Une convention de partenariat avec l'INRAN est en cours de finalisation et des axes de collaboration ont été définis avec l'ICRISAT/Niamey
		Activité 6 : Conduire des activités de démonstration sur la transformation de l'oignon	1	0	100	20 000 000	0		la convention avec l'INRAN n'est pas encore en vigueur
		Activité 3: Réhabilitation du Laboratoire national des semences	1			Cf. convention DGA			Elaboration des TDR pour l'acquisition du matériel dans le cadre de la réhabilitation du laboratoire national des semences conformément au protocole d'accord technique signé entre le PRODEX et la Direction Générale de l'Agriculture.
		Activité 5: Conduire des tests d'introduction d'emballage standardisé en relation avec les comptoirs de commercialisations	1	0	0	15 000 000	1 612 250	12	Organisation de la mission préparatoire des tests sur les emballages filets des oignons du Niger au niveau des comptoirs d'Agadez et de Tsernaoua (Konni). Le projet d'Emball Mali 2000 sacs filets de deuxième génération de 50 kg pour conduire le test au niveau de deux comptoirs.
	R5-A3 : Les activités des	Activité 1: Convention avec la DGPIA	1	1	100	28 500 000	737 500	2.5	Les deux conventions de partenariat (la Direction Générale de la Production et des

	filères sont suivies par les services spécialisés								Industries Animales et la Direction Générale de l'Agriculture) sont en cours d'exécution avec la désignation d'un expert par convention et la participation des experts à la mise en œuvre des activités du Projet dans leur sphère de compétence.
		Activité 2: Convention avec la DGA	1	1	100	41 000 000	643 750	1.6	
TOTAL COMPOSANTE						1 408 247 500	892 775 799	63.4	

2.2. Composante B. Mise au point d'instruments de financement

2.2.1. Présentation de la composante

Cette composante vise à satisfaire les besoins financiers pour le développement des petites et moyennes entreprises et coopératives dans le court terme et jeter les bases d'un financement durable du secteur. A cet effet, la composante est structurée en 3 sous composantes ci-dessous :

(a) Mécanisme des Dons de contrepartie :

L'objectif visé par cette sous composante est la mise en place d'un instrument de financement à coûts partagés qui ciblera les sous-projets relatifs à la production, à la collecte primaire et à la commercialisation. Ces sous-projets seront financés sur appel à propositions en fonction de la rentabilité des modèles d'affaires. Le financement couvrira les coûts liés à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du plan d'affaires.

(b) Facilitation de l'accès au crédit :

Cette sous-composante vise à apporter une assistance technique aux institutions financières pour le développement de produits spécifiques afin d'améliorer la capacité de l'offre financière au secteur agricole. Les activités de cette sous composante comprendront une assistance technique à quelques institutions financières pour élaborer et vulgariser des instruments spécifiques au secteur agricole tels que le financement de l'offre des intrants, des crédits stockage (warrantage), les microcrédits, le financement des équipements, le crédit-bail pour l'acquisition des équipements agricoles/de transformation/de stockage et le financement du commerce. Elle prévoit également des instruments financiers spécifiques pour l'élevage et les produits animaux.

(c) Contribution à la mise en place d'instruments de financement durables :

La sous composante a pour objectif d'aider le gouvernement dans la réalisation de l'objectif de la SDR qui consiste à mettre en place un Fonds des filières, à travers une réflexion organisée sur le bien-fondé et la faisabilité de ce fonds d'investissement, et la garantie qu'il est mis en place de concert avec les institutions financières.

2.2.2. Bilan de la mise en œuvre des activités

Tableau 2 : Synthèse activités composante B Mise au point d'instruments de financement

S/composante	Résultats	Activités	Prévisions Physiques	Réalisations Physiques	%	Prévisions Financières	Réalisations Financières	%	Commentaires
B1 Mécanisme des Dons de contrepartie (Matching Grant/Financement des sous projets)	R1-B1 : Le manuel de procédures de financement de sous projets est révisé, validé et diffusé	Activité 1 : réviser le manuel de procédures de financement des sous projets	1	0	0	1 000 000	0		RAS
		Activité 2 : Valider le manuel révisé	1	0	0	3 000 000	0		RAS
		Activité 3 : Diffuser le manuel révisé	8	0	0	12 000 000	0		RAS
	R2-B1 : Les sous projets des filières cibles sont élaborés et financés	Activité 1 : Former les AGEX sur le manuel de procédures des sous projets	1	1	100	2 500 000	2 500 000	100	24 cadres des agences d'exécution des filières, de l'AT, les 3 experts filières formés sur : Les critères d'éligibilités des sous projets ; Les activités éligibles, les acteurs, les montants plafonds et les niveaux de contribution ; Le processus de génération des sous projets ; Les procédures de passation de marchés ; Les procédures de décaissement des sous projets ; La gestion environnementale et sociale des sous projets ; Le suivi évaluation des sous projets ; Les outils : Formulaire de demande des sous projets,
		Activité 3 : Simplifier et éditer le manuel de procédures de	2000 SP	0	0	3 000 000	0	0	Les fiches simplifiées ont été élaborés et validées par l'UCTF, il reste l'édition et la diffusion

		financement des sous projets							
		Activité 3: Elaborer les sous projets des filières cibles	805	1507	187				
		Activité 4.1 : Organiser les sessions des comités d'approbation des sous projets	48	18	75	48 000 000	15 584 220	32	
		Approuver les sous projets	773	1208	156	PM	PM		<i>Dont 1145 sous projets de filière oignon, 45 sous projets de la filière BVCP et 18 sous projets de production de semences de niébé</i>
		Activité 6 : Financer les sous projets	1007	986	98	2 010 500 000	1 153 490 658	57	<i>Dont 979 510 293 FCFA de décaissement IDA et 173 980 385 FCFA d'apport des promoteurs</i>
	R3-B1 : les sous projets financés sont suivis	Activité 1 : Superviser la mise en œuvre des sous projets	32	1	0	16 000 000	7 285 085	46	
B2 Facilitation de l'accès au crédit	R1-B2: Les IMF partenaires sont sélectionnées et appuyées.	Activité 1 : Appuyer le comité de sélection	1	0	0	2 000 000	0	0	
		Activité 2 : Apporter un appui institutionnel et technique aux IMF	Pm			Pm			
		Activité 3 : Mettre en place un fonds de garantie partielle aux PME	Pm			Pm			<i>Manifestation d'intérêt le recrutement de banques partenaires lancée, les banques ont répondues, il reste la mise en place du comité pour la sélection.</i>
	R2-B2 : Une assistance technique est	Activité 1 : Recruter l'Assistance	1	1	100	20 500 000	0	-	<i>Manifestation d'intérêt le recrutement de l'AT est lancée, les propositions sont attendues.</i>

	apportée aux Banques commerciales et aux IMF	Technique							
						2 185 500 000	1 181 329 063	54	

2.3. Composante c : sécurisation du potentiel d'irrigation

2.3.1. Présentation de la composante

L'objectif de cette composante est de sécuriser le potentiel de production de l'oignon à partir de systèmes irrigués et de connecter les sites de production retenus aux marchés. Les activités à mener dans le cadre de cette composante sont structurées dans trois sous composantes, à savoir:

❖ Sous composante C1 : Construction, réhabilitation et protection des sites

Cette sous composante vise à contribuer à la consolidation des zones de production irriguée à base d'oignon, par la réhabilitation ou la construction d'ouvrages communautaires sur les sites d'irrigation, tels que :

- les seuils d'épandage, les petits barrages et les déversoirs de moins de 5 mètres de hauteur, pour la recharge des nappes phréatiques ;
- les ouvrages de protection des sites irrigués menacés d'ensablement.

❖ Sous composante C2 : Facilitation de l'accès aux marchés

La sous composante vise à soutenir la réhabilitation ou la construction des pistes de désenclavement qui relient les zones de forte production des filières ciblées aux marchés.

❖ Sous composante C3 : Suivi environnemental

La sous composante a pour objectif d'assurer le suivi environnemental des sols et des ressources en eau souterraines (nappes fragiles) ainsi que les ressources en eaux de surface dans les sites sensibles du projet ; de mettre en place les outils et procédures de gestion environnementale, et d'assurer le renforcement des capacités des acteurs tant au niveau régional que national.

2.3.2. Bilan de la mise en œuvre des activités

Tableau 3 : Synthèse des réalisations physiques et financières de la composante C

Sous composante	Résultats/Activités	Prévisions Physiques	Réalisations Physiques	%	Prévisions Financières	Réalisations Financières	%	Commentaire
Sous composante C1 : Construction, réhabilitation et protection des sites	R1-C1 : Le seuil de recharge des nappes de Tomboulana (Badam1) et de Gofat sont réalisés							
	Activité 1.1. Réaliser les seuils de recharge des nappes de Tomboulana et de Gofat	2	2	100	2 500 000	1 480 000	59	<ul style="list-style-type: none"> Les documents APD et EIES validés ont été soumis pour revue préalable à la Banque mondiale Avis de la banque pour l'adjudication de Tomboulana en attente. Finalisation de Gofat réalisée et transmis à l'IDA pour avis
	✓ Restitution des dossiers techniques	1	1	100	PM			
	✓ Tenue d'un CTS pour l'approbation des sous-projets	2	1	50	800 000	523 600	66	
	Activité 1.2 : Finaliser les études techniques des ouvrages de recharges de Gofat							Dossiers techniques finalisés sont transmis pour avis
	✓ Elaboration des TDR	1	1	100	PM	PM		
	✓ Approbation des TDR	1	1	100	PM	PM		
Activité 1.3. Recruter un cabinet d'études pour le suivi contrôle des travaux des deux (2) seuils de Gofat							<ul style="list-style-type: none"> Réalisé Avis de la banque pour l'adjudication en attente 	
✓ Elaboration des TDR	1	1	100	PM	PM	-		
✓ Approbation des TDR	1	1	100	PM	PM	-		
Activité 1.4 : Identification des sites d'ouvrages à Zinder, Diffa, Tillabéri et Dosso	1	1	100	1 750 000	1 735 238	99	<ul style="list-style-type: none"> 13 sites d'ouvrages identifiés pour la sécurisation de 3 285 ha de terres irrigables. 	
	✓ Lancement DAO et sélection d'entreprises							
	R2-C1 : Les Comités de gestion des ouvrages sont mis en place et opérationnels							
	Activité 2.1 : Mettre en place et rendre opérationnel (former et équiper) les comités de gestion des ouvrages							<ul style="list-style-type: none"> La formation des comités de gestion est prévue en juillet, n'a

Sous compo sante	Résultats/Activités	Prévisions Physiques	Réalisations Physiques	%	Prévisions Financières	Réalisations Financières	%	Commentaire
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mission de mise en place des comités de gestion ✓ Renforcement des capacités des comités 	2	2	100		cf. Activité. 1.1		pas pu se réaliser du fait de retard du processus d'adjudication des entreprises
		1	0	0	1500 000	0	0	
	R3-C1 : Les études technico-économiques et environnementales des ouvrages de recharge sont conduites							
	Activité 3.1: Conduire les études techniques pour les sites d'ouvrages identifiés dans les régions de Maradi et Tahoua <ul style="list-style-type: none"> ✓ Approbation TDR ✓ Lancement avis ✓ Conduite de la mission d'études 	1	1	100	PM	PM	PM	<ul style="list-style-type: none"> • Etudes réalisées au stade APD et DAO • Processus de validation en cours
		2	2	100	400 000	785 400	196	
		2	2	100	70 000 000	39 016 600	56	
	Activité 3.3. Conduire les études techniques et suivi/contrôle des Seuils dans la région d'Agadez <ul style="list-style-type: none"> ✓ Elaboration des TDR études techniques ✓ Approbation TDR 	1	1	100	PM	PM	-	<ul style="list-style-type: none"> • Attente de l'avis de la BM
		1	0	0	PM	PM	-	
	R6-C1 : Les périmètres irrigués menacés sont protégés							
	Activité 6.3 : Mettre en œuvre les sous projets de protection des sites menacés prioritaires <ul style="list-style-type: none"> ✓ Elaboration des dossiers de sous projets de Protection environnementale ✓ Approbation sous projets ✓ Financement des sous projets 	16	16	100	PM	PM		<ul style="list-style-type: none"> • Trois sous projets dont 2 dans la région de Tahoua et un sous projet dans la région de Dosso ont été conventionnés pour un cout global de 99 978 596 F CFA, • Démarrage des travaux en novembre
		5	3	60	PM	PM		
		5	0	0	75 000 000	0		
	SOUS TOTAL C1				343 150 000	46 738 838	14	

Sous-Composante	Résultats/Activités	Prévisions Physiques	Réalisations Physiques	%	Prévisions Financières	Réalisations Financières	%	Commentaire	
	R1- C2 : Des pistes de désenclavement des zones de production de Janao-Tambey et Arewa-Kabobi sont réalisées								
Sous composante C2 : Facilitation de l'accès aux marchés	Activité 1.1 : Conduire une étude d'évaluation sociale et élaboration de PAR <ul style="list-style-type: none"> ✓ Approbation TDR ✓ Lancement avis ✓ Conduite de l'étude 	1 1 1	1 1 1	100 100 100	PM PM 0	PM PM 1 142 000		<ul style="list-style-type: none"> • Le rapport du PAR est transmis à l'IDA pour avis. 	
	Activité 1.2 : Conduire une mission de la COFODEP pour la sécurisation foncière de l'emprise <ul style="list-style-type: none"> ✓ Approbation TDR ✓ Lancement avis ✓ Conduite de la mission 	1 1 1	1 1 1	100 100 100	PM PM 0	PM PM 1567 000		<ul style="list-style-type: none"> • Le rapport de la COFODEP est transmis à l'IDA. 	
	Activité 1.3. Restituer les études techniques (APS, APD et EIES) <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mission de restitution APD et EIES ✓ Lancer les DAO 	1 1	1 0	100 0	1 000 000 400 000	2 687 802 0	269 0	<ul style="list-style-type: none"> • Deux missions de restitution ont été conduites, les DAO sont phase de finalisation, • Le lancement des DAO n'a pas pu avoir lieu pour raison de retard du processus lié à la prise en compte des aspects PAR 	
	R2- C2 : Les études technico-économiques et environnementales des pistes de désenclavement des zones de production des filières cibles sont conduites								
	Activité 2.1 : Identification complémentaire des pistes prioritaires	1	1	100	1 500 000	1 492 956	99.5	<ul style="list-style-type: none"> • Les missions de diagnostic ont été conduites au total 83.5km ont été retenus dans les 8 régions 	
	Activité 2.2 : Conduites des études techniques des pistes de désenclavement des zones de production <ul style="list-style-type: none"> ✓ Elaboration des TDR ✓ Approbation des TDR ✓ Lancement avis et sélection 	1 1 1	1 1 1	100 100 100	PM PM 400 000	PM PM -		<ul style="list-style-type: none"> • Les TDR des études des pistes prioritaires 83.5km ont été finalisées et approuvés par l'IDA, • Réception des manifestations le 11 octobre 2011 	

Sous compo sante	Résultats/Activités	Prévisions Physiques	Réalisations Physiques	%	Prévisions Financières	Réalisations Financières	%	Commentaire
	R3- C2 : La convention de collaboration avec la DGGR est mise en œuvre							
	Activité 3.1 Appui à l'expert en irrigation mis à la disposition du projet	1	0.5	50	1500 000	1 400 900	93	
	SOUS TOTAL C2				362 550 000	8 290 658		
Sous composante C3 : Suivi environnemental	Résultat 1 : Les capacités des cadres des AGEX sont renforcées							
	Activité 1.1 : Organiser un atelier d'intériorisation sur les procédures de gestion environnementale et sociale des sous projets en faveur des cadres des AGEX ✓ Elaboration des TDR ✓ Approbation TDR ✓ Organisation atelier de formation	1 1 1	1 1 1	100 100 100	PM PM 6 000 000	PM PM 5 572 360	- - 93	La formation est organisée au profit de 64 personnes (responsables régionaux et prestataires locaux secondaires des agences d'exécution)
	Activité 1.2: Organisation des ateliers (formation Prestataires secondaires AGEX Oignon et Niébé sur pesticides) ✓ Elaboration des TDR ✓ Approbation TDR ✓ Organisation atelier de formation	1 1 1	1 1 1	100 100 100	PM PM 4 000 000	PM PM 5 572 360	- - 139	La formation est organisée au profit de 49 prestataires locaux secondaires des agences d'exécution et deux (2) Point focaux régionaux /PRODEX
	Activité 1.3 : Conduire un test d'efficacité des bio-intrants ✓ Elaboration des TDR ✓ Approbation TDR ✓ Conduite du test	1 1 1	1 1 0	100 100 0	PM PM 4 000 000	PM PM 0	- - 0	Les TDR sont soumis à l'IDA pour avis.
	Résultat 3 : La mise en œuvre des procédures de gestion environnementale et sociale est suivie et évaluée							
	Activité 3.1. Mettre en œuvre la convention PRODEX/BEEEI ✓ Elaboration des TDR ✓ Approbation des TDR ✓ Conduite des missions régionales de surveillance environnementale et sociale des sous projets financés par le PRODEX	1 1 32	1 1 16	100 100 50	PM PM 16 000 000	PM PM 7 607 746	- - 48	Les premières missions de surveillance ont été organisées aussi bien au niveau national que dans les régions

Sous compo sante	Résultats/Activités	Prévisions Physiques	Réalisations Physiques	%	Prévisions Financières	Réalisations Financières	%	Commentaire
	✓ Conduite des missions nationales de supervision de la surveillance environnementale et sociale des sous projets financés par le PRODEX	2	1	50	6 000 000	2 738 144	46	
	Résultat 4 : Le suivi environnemental des ressources en eau souterraines dans les bassins d'irrigation est assuré							
	Activité 4.1. Mettre en œuvre la convention PRODEX/CNSEE ✓ Révision de la convention	1	En cours		PM	PM	-	Les plans d'actions des différents partenaires sont en cours d'élaboration. La révision de la convention prendra en compte les nouvelles activités et budgets des plans d'actions
	✓							
	SOUS TOTAL C3				77 000 000	21 490 610	28	
	TOTAL COMPOSANTE C				782 700 000	76 520 106	10	

2.4. Composante D. Coordination, gestion, suivi et évaluation

2.4.1. Présentation de la composante

(a) **La cellule de coordination technique et fiduciaire:** Cette sous composante supportera les coûts relatifs au personnel, à l'équipement et au fonctionnement de l'UCTF et ceux liés au fonctionnement des points focaux régionaux. La sous-composante prendra également en charge les coûts d'exploitation et de formation associés au système de gestion financière du projet, y compris les audits externes, ainsi que l'activité périodique de planification et de budgétisation aux niveaux régional et national.

(b) **Suivi et évaluation :** A travers cette sous composante, le projet financera l'étude, l'installation et la mise en œuvre d'un système de suivi évaluation. Il contribuera également au fonctionnement du Comité de Pilotage et à la supervision du Programme 3 de la SDR

2.4.2. Bilan de la mise en œuvre des activités

Tableau 4 : Synthèse Activités Gestion Comptable, Financière et du Personnel

S/composante	Résultats	Activités	Sous activités	Indicateurs	Prévisions Physiques	Réalisations Physiques	%	Montant prévu	Montant réalisé	% réel	Commentaires
D1 : Gestion et Coordination du Projet	R1-D1 Les capacités du projet sont renforcées	Elaborer un plan de formation Mettre en œuvre un plan de formation	Former le personnel	PLAN Nbre de pers	1 10	1 1	 10	 73 000 000	 3 715 500	 5,09	L'IDA a donné un avis favorable sur certaines formations d'autres ont fait l'objet des commentaires Mise en œuvre partielle
	R2-D1 La rémunération du personnel est assurée	Mettre en place les ressources humaines pour la gestion, la coordination et le suivi évaluation des activités du Projet	Consultants UCTF Personnel appui Assurer la couverture médicale d'appui pers	Cadres Personnel Personnel	9 14 14	9 14 14	100 100 100	125 280 648 22 859 616 12 936 000	91 608 911 16 908 563 8 831 200	73,12 73,96 68,26	Personnel assuré
	R3-D1 Frais de mission des cadres sont assurés	Organiser des missions	Rapport	TDR	12	11	92	20 400 000	18 442 300	90,4	
	R4-D1 L'Audit des comptes 2010 et du PPF est réalisé	Organiser l'audit	Contrat	Rapport	1	1	100	10 000 000	9 000 000	90	Le rapport de l'audit a été transmis à la banque mondiale à temps, ce rapport n'a pas suscité de commentaires de la banque mondiale. Il a

S/composante	Résultats	Activités	Sous activités	Indicateurs	Prévisions Physiques	Réalisations Physiques	%	Montant prévu	Montant réalisé	% réal.	Commentaires
											été diffusé aux autres ministères techniques
		Mettre le matériel complémentaire des moyens de travail à la disposition du personnel du projet	Acquisition matériels		1lot	1lot	100	4 150 000	5 624 900	135,53	
		Elaborer le plan de Trésorerie	Elaborer plan	Plan	2	2	100	PM	PM		
		Elaborer la demande de fonds base RFINA	Préparation demande	Demande	4	3	75	PM	PM		
		Elaborer les rapports RFINA	Rapports	Rapport	4	2	50	PM	PM		
		Préparer l'Audit des comptes 2011	Travaux de fin d'exercice	Rapport	1	0	0	PM			Prévue en 2012
		Faire l'inventaire 2011	Inventaire	Inventaire	1	0	0	PM			Prévue en fin 2011
	R6-D1 Le budget 2011 est élaboré et approuvé	Elaborer le PTBA 2012	PTBA	Projet PTBA	1	0	0	PM			Prévue en fin 2011
		Approuver le PTBA 2012		Session CIP	1	0					

Tableau 5: Situation cumulée du décaissement par rubriques de dépenses sur le fonds IDA sur le PTBA 2011 du PRODEX au 30/09/2011.

Libellés	Montant initial	Montant décaissé	
		FCFA	%
Investissement :	4264003764	2 171 452 828	95%
Fonctionnement :	297249000	123 228 932	5%
Total :	4 561 252 764	2 294 681 760	100%
%		50.31%	

Commentaire analytique : Le taux de décaissement du crédit par rapport au PTBA 2011 est 50.31% sur lequel il y a 95% d'investissement et 5% de fonctionnement au 30 septembre 2011.

Tableau 6: Exécution budgétaire au 30/09/2011 en FCFA y compris les engagements fermes

Composantes	Budget Total	Prévision globale par bailleur		Réalizations				Taux
		IDA	Bénéficiaires	IDA	Bénéficiaires	Engagement ferme	Total réalisation	
A	1 408 247 500	1 408 247 500	-	892 775 799	-	203 732 270	1 096 508 069	78%
B	2 185 500 000	1 828 100 000	357 400 000	1 002 608 598	173 980 385	371 129 008	1 547 717 991	71%
C	782 700 000	759 030 000	23 670 000	94 040 842	-	111 280 050	205 320 892	26%
D	565 875 264	565 875 264	-	305 256 521	-	2 624 556	307 881 077	54%
TOTAL G	4 942 322 764	4 561 252 764	381 070 000	2 294 681 760	173 980 385	688 765 884	3 157 428 029	64%

Commentaire analytique : le niveau d'exécution financière du budget 2011 au 30 septembre 2011 est de 64%

Tableau 7: Situation cumulée du décaissement par catégories de dépenses sur le fonds IDA au 30/09/2011 (source : client connection) Banque Mondiale

Catégories	Montant Alloué	Montant décaissé		Non décaissé
		FCFA	%	
Catégorie 1 :	13 225 389 568	2 088 737 153	15,79	11 136 652 416
Catégorie 2 :	6 517 957 037	156 834 347	2,40	6 361 122 690
Remboursement PPF	341 055 891	240 711 640	70,57	100 344 252
DA-A PPF	0	9 302 921		-9 302 921
DA-B COMPTE D	0	1 261 967 597		- 1 261 967 597
Total :	20 084 402 497	3 757 553 658	18,71	16 326 848 839

Commentaire analytique : le taux de décaissement du crédit à la date du 30 septembre 2011 est de 18,71%.

Une demande de remboursement pour un montant de 1.143.550.927 FCFA a été envoyée et approuvée par l'IDA le 12 octobre. Ce taux passera à 24,40%.

Tableau 8: Synthèse des réalisations physiques et financières de la passation des marchés

S/composante	Résultats	Activités	Indicateurs	Prévisions Physiques	Réalisations Physiques	%	Prévisions Financières	Réalisations Financières	%	Commentaires
	RI0D1: Le Plan de passation de marchés est élaboré et approuvé	Elaborer le plan de passation de marchés (PPM) avec les cadres de l'UCTF	PPM élaboré	1	1	100	PM	PM	-	Le PPM a été élaboré avec la participation des experts de l'UCTF
		Transmettre le plan de passation de marchés pour approbation à la BM; au MDA; à l'ARMP; à la DGCMP	PPM approuvé	1	1	100	PM	PM	-	Le PPM a été approuvé par la Banque Mondiale le 21 mars 2011 et transmis au Ministère de l'Agriculture et à l'ARMP
	R11-D1: Le plan de passation de marchés est mis en œuvre	Elaborer et soumettre pour avis les DAO	DAO	3	3	100	PM	PM	-	Les DAON BADAM, GOFAT, et PISTES sont élaborés et soumis pour avis
		Elaborer et mettre en œuvre les Dossier de demande de cotation	Cotation	13	13		PM	PM	-	13 dossiers de demande de cotation ont été exécutés
		Lancer les avis d'appel d'offres et les avis à manifestations d'intérêt	Avis	15	15	100				Un avis d'appel d'offre travaux a été lancé 14 Avis à manifestation d'intérêt ont été lancés
		Organiser les commissions ad hoc d'adjudication et les comités d'experts	Commission	13	13	100				11 commissions ad hoc d'ouverture et d'évaluation des manifestations d'intérêt ont été organisées 1 commission d'adjudication des offres de BADAM et 1 comité d'experts ont été organisés
		Négocier, préparer et suivre les contrats	Contrat	10	9	90				9 contrats DE CONSULTANTS ont été négociés, préparés et suivis. L'étude bon d'enlèvement a été relancé

Tableau 9 : Volet Communication du Projet

S/composante	Résultats	Activités	Sous activités	Indicateurs	Prévisions Physiques	Réalisations Physiques	% prévu	Montant prévu	Montant réalisé	% réel	Commentaires
01 : Gestion et Coordination du projet	R11-D1 Le plan de communication est mis en œuvre	La finalisation de la stratégie de communication	validation	doc	1	1	100	500.000	692.000	138,4%	Le document de la stratégie de communication a été validé le 28 Avril 2011. Le site web a été lancé le même jour. Les TDR de la gestion du site Web ont reçu la non objection de Banque Mondiale.
		la création et la finalisation du site Web	Rendre le site fonctionnel	site web	1	1	100	12000000	0	0	
		Les couvertures médiatiques	Radio TV	nbre de couvertures	ND	6					
		un documentaire sur l'oignon	Réaliser un documentaire	Un film	ND	1		500000	250000	50%	
		Réalisation bulletin	Publication	bulletin	4	1	25	2800000	1.874.250	66,9%	Le premier numéro est publié en juillet
		Contrats radio	TDR élaboré	nombre	24	0	0	9984000			Les radios ont été identifiées par les points focaux. Les propositions financières sont faites. Il reste à conclure les contrats de prestation
		Confection tee shirt et casquettes	réalisation	nombre	T-shirts : 1000 casquettes :500	1040 500	100	2000000	3873750	194%	
		Confection et installation des panneaux	TDR élaboré	nombre	24	9	38%	2.400.000	793.500	33%	Réalisation effective dans trois régions et en cours dans cinq régions
		Réalisation émission radio	réaliser des émissions	nombre	5	2	40	1.000.000	0	0	
	Achat caméra	achat	Nombre	-caméra photo,	1 caméra,	100%	3000000	3944.493	131,48%		

S/composante	Résultats	Activités	Sous activités	Indicateurs	Prévisions Physiques	Réalisations Physiques	% prévu	Montant prévu	Montant réalisé	% réel	Commentaires
		numérique, télé, poste radio			télé, poste radio	une télé, un poste radio					
		Publication dans les journaux	insertion	Articles	ND	4		2000000	1095000	54,75%	Cette activité couvre toute l'année
		Réalisation chemises	Elaboration note de cadrage technique	Nombre	2000	0		2.000.000	0		Note de cadrage élaborée le 15 Aout 2011

Sous composante D2 Suivi et évaluation

Tableau 10 : Bilan de la sous composante D2

Résultats	Activités	Prévisions physiques	Réalisations physiques	Taux réalisation	Prévisions financières	Réalisations financières	Taux	
RI-D2 : Résultats 1 : Le cadre de suivi et évaluation est opérationnel	- Valider le manuel de suivi évaluation du Projet	0	0		5 000 000	3 895 480	78	Le manuel de suivi évaluation et ses annexes ont été validés au cours d'un atelier qui a regroupé une trentaine d'acteurs du dispositif interne de suivi des activités du Projet.
	- Actualiser les données statistiques pour le suivi des performances	1	1	100	10 000 000	3 810 000	38	L'étude a été réalisée et les données ont été validées au cours d'un atelier qui a regroupé les acteurs des filières agro sylvo pastorales. (rapport disponible)
	Conduire l'étude sur la situation de référence de l'évaluation d'impact	1	0	100	23 000 000	833 500	4	Elaboration de fiches harmonisées pour la collecte des données sur les O.P.F et PME Conduite des enquêtes de collecte de données sur le diagnostic des OP (fin du diagnostic prévu en mi juillet pour les 3 filières, Identification des axes majeures de l'EI à travers : question principale : question transversale et question par filière QP : <i>Quelle est l'impact des activités de sur le bien-être (revenues) des ménages?</i> QT : <i>comment ces différents effets varient –ils suivant le genre (hommes, femmes)</i> Sous questions : F oignon : 4 sous questions F Niébé : 3 sous questions F bétail viande : 2 sous questions Conception de la maquette de saisie CSPRO, Plus de 1 500 fiches saisies sur CSPRO

	Suivre et contrôler les activités sur le terrain - Mission supervision interne	4	3	75	8 000 000	582 000	7,27	Trois missions d'appui à la mise en œuvre des sous projets ont été organisées dans les huit régions du pays. Ces missions de supervision ont été sanctionnées de rapport de mission avec des recommandations.
	- Mission supervision conjte	2	2		16 000 000	9 423 178	59	Deux missions d'appui à la mise en œuvre du Projet de développement des exportations et des marchés agro-sylvo-pastoraux (PRODEX) ont a eu lieu du 15 au 28 Février et du 27 juin au 8 juillet 2011.
	- Organiser des missions de supervision par le CP	2	1		5 000 000	2 697 500	54	Une mission du CIP composé de deux cadres de la DEP/MA, un cadre de la DGGR /MA et un cadre du Ministère des Finances a organisé une mission de supervision des activités du Projet est dans les huit régions du pays.
R2-D2 : La collecte le traitement et l'analyse des données sont assurés	Activité 1 : Collecter, traiter et analyser les données	PM	PM					Activité continue
	Activité 2 : Apporter des améliorations aux bases de données à travers une assistance technique.	1	1		3 000 000	500 000	17	Appui à la base de données des sous projets dans le cadre de la consolidation de la base Une base consolidée est disponible sur le suivi des sous projets.
R4-D2 : La capacité des acteurs de suivi évaluation est renforcée	Activité 2 : Former les acteurs sur les principes de l'évaluation d'impact	1	1		PM	4 360 000		Participation à l'atelier multi-pays pour l'évaluation d'impact des adaptations de l'agriculture (5 cadres du MAG/EL, MFE, INS , l'INRAN et du PRODEX.).

R3-D2 : La présentation et la diffusion de l'information sont assurées	Activité 3.1 : Elaborer et Consolider les rapports d'activités	4	1	25	PM	PM		Rapport du 1er trimestre 2011
R5-D2 : Une base de données SIG est créée et alimentée	Activité 1 : Acquérir le logiciel	1			4 000 000	0	0	RAS
	Activité 2 : Fournir les GPS	11			3 300 000	0	0	8 GPS fournis et envoyés aux PF, le reliquat est prévu dans les TDR de formation approuvée par l'IDA.
	Activité 3 : Former des cadres et assurer l'accompagnement de la gestion du logiciel	1			4 000 000	0	0	TDR élaborés et approuvés par l'IDA. Formation prévue après la mission de supervision d'octobre 2011
R6-D2 : Le Comité de Pilotage du Programme 3 de la SDR appuyé	Activité 2: Appuyer la SDR	1	0	0	6 500 000	0	0	RAS
	Activité 2: Etat des lieux des pépinières fruitières et des centres de multiplication de semences	1	1	100	3 500 000	3 500 000	100	Mission sur l'état des lieux des filières porteuses ciblées du PRODEX (production, conditionnement, conservation, transformation /commercialisation, avantages comparatifs par région, atouts et contraintes et perspectives Etat des lieux des pépinières fruitières et des centres de multiplication de semences (SMS) cf. rapport de mission disponible
Sous total D2					81 300 000	29 601 658	36	

1. PERSPECTIVES

- 1. Mise en œuvre les plans d'action des filières prioritaires
(renforcement des capacités des OPFs/ PME, tenues forums filières,
etc.**
- 2. Financer les sous projets des chaines de valeur des filières
prioritaires (oignon, niébé, bétail, viande/cuir et peaux)**
- 3. Élaborer, valider et financer les sous projets de second ordre (sésame,
souchet et gomme arabique)**
- 4. Financer les sous projets du troisième guichet (autres filières)**
- 5. Financement des sous projets d'investissements structurants (seuils
de recharges, Protection rapprochée des sites et pistes)**
- 6. Poursuivre la mise en œuvre des conventions de partenariat avec:
DGA, DGPIA, DGGR, BEEEI, CNSEE, USAID/ATP, INRAN et
l'ICRISAT.**

ANNEXES

Annexe 1 : RESULTATS ATTEINTS (indicateurs de performance du Projet)

Tableau 11 : Plan de suivi des indicateurs de performance

Indicateurs des résultats du projet	Référence	Valeurs cibles					Reformulation des indicateurs (date, cause de reformulation)	Niveau cible en année n prévision 2011	Réalisation au 30 septembre 2011	Cumul
		AN1 2009	AN2 010	AN3 011	AN4 012	AN5 013				
Les producteurs soutenus par le projet ont augmenté de 25% la valeur des produits commercialisés	En milliard de FCFA Oignon: 80,42 Niébé: 66.88 Sesame : 20.335 Souchet : 6.356 Gomme arab:13.259 Bétail sur pied: 259.160	-	5%	15%	20%	25%	RAS	15%	0	
Indicateurs intermédiaires de résultats										
Indicateurs intermédiaires du résultat 1: ▪ Les plans opérationnels annuels d'au moins trois chaînes d'approvisionnement sont mis en œuvre de façon régulière		1	2	3	3	3	RAS	3	0	3 plans d'action élaborés et validés La mise en œuvre des activités des plans opérationnels a commencé avec l'appui des AGEX des trois filières prioritaires

Indicateurs des résultats du projet	Référence	Valeurs cibles					Reformulation des indicateurs (date, cause de reformulation)	Niveau cible en année n prévision 2011	Réalisation au 30 septembre 2011	Cumul
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les volumes exportés par les bénéficiaires du projet sur des filières retenues ont augmenté de 15% 	Oignon : 134508 t Niébé : 70 809 t Sesame : 59 585 t Souchet : 21 194 t Gomme ara : 94 t Bétail sur pied : 316 944 UBT	-	5%	8%	12%	15%	RAS	8%	0	Une situation de référence a été faite, sur l'actualisation des données statistiques (rapport disponible)
Indicateurs intermédiaires du résultat 2: - 2300 sous projets financés dans le cadre des mécanismes de fonds à frais partagés - 80% des sous projets sont mis en œuvre avec succès	0	-	150	600	850	700	RAS	75%	990	Au 30 septembre 2011, 1483 sous projets, ont été approuvés dont, 1416 d'irrigation à base d'oignon, 49 de bétail, viande /cuirs et peaux et 18 de production de semence de niébé. Le nombre de sous projets financés s'élève à 990 pour un coût global de 1 222 578 955 F CFA
		-	75%	75%	80%	80%	RAS			
Indicateurs intermédiaires du										Approbation de 2 dossiers

Indicateurs des résultats du projet	Référence	Valeurs cibles					Reformulation des indicateurs (date, cause de reformulation)	Niveau cible en année n prévision 2011	Réalisation au 30 septembre 2011	Cumul
		-	250	750	1500	2000				
résultat 3: ■ Au moins 2000 ha de terres irrigués ont été protégés grâce aux ouvrages de protection; ■ Au moins 105 Km de pistes de production ont été construits ou réhabilités	0	-	250	750	1500	2000	RAS	250	0	d'investissements structurants (seuils de recharges) et de 3 dossiers de protection de sites menacés pour un montant total de 313 571 677 FCFA permettant de protéger 1374 ha de sites Etudes réalisées pour deux tronçons de piste de 20 km de longueur (rapport final disponible)
	-	20	70	105	105	RAS	20	0		

Tableau 12:PSR identifiés par AGEX et par qualification

Region	PS AGEX Oignon	PS AGEX BVCP	PS AGEX Niébe	Total region
Agadez	GIE Tagazat	GIE Air		4
	GIE Air	DEVLOC Annai		
	GIE Takroust			
Diffa	ONG Kouri	Sahel action		4
	ONG Marhaba	SVND Sahel Actions		
		ONG Kouri		
Dosso	GIE Agro-business	Ibrahima Yahaya TOURAOU	GIE Niyya	8
	ONG ONCCP YAKIDA TALAUCI		GIE A et B	
	Consortium ONG ONDS - VEDDN		ONG CDR	
	GIE Niyya			

Region	PS AGEX Oignon	PS AGEX BVCP	PS AGEX Niébé	Total region
Maradi	GIE Foussouha		CEFP Nakaura	8
	GIE Taimako Manoma		GSC Taimako Manoma	
	GIE Alheri		GSC Alhéri	
	CECAPER	GIE ADLI		
	CEFP Nakaura	CEFP Nakaura		
	OSE IL ED YANAYI			
Niamey	GIE Labu Si tari	Seybou BEIDARI	ONG Ecodel	16
	GIE Niyya	CESAO PRN	GIE Niyya	
	GIE Marahaba	AGROVET Sahel	ONG CDR	
	Secodev	GIE Bonkaney		
	Albarka	Agropast Consult		
	ONG AP/DB - FANSA	SECODEV		
	ONG CAPE	GADR-RA		
	ADRI			
ONG AIDB				
Tahoua	GIE Nagari Nakowa		GSC Guiguigna	12
	AGRI - Bilan		GIE Husa'a Da Nazari	
	GIE Guiguigna		ONG CDR	
	ONG IVEDES - GAMSUWA			
	GIE Wadata			
	ONG REFORM	SEVEPROX		
	Cadel	DISEL		
	Assissigri	Assissigri		
Tillabery	GIE Bonférey			5
	GIE Niyya		GIE Bonférey	

Region	PS AGEX Oignon	PS AGEX BVCP	PS AGEX Niébe	Total region
	GIE Bonse		ONG Ecodel	
	CPS		GIE Niyya	
Zinder	GIE Husa'A		Grade Ci-Gaba	4
	GIE Grade Ci Gaba		ONG ACTSER HIMMA	
			ONG CDR	
Total	38	18	18	

Tableau 13 : Nombre d'acteurs /prestataires formés

Catégorie d'acteurs	Agex oignon	Agex bétail viande/cuirs et peaux	Agex Niébe	Total
ONG	9	10	26	45
GIE	21	8	20	49
Bureau d'étude	8	10	3	22
Consultant individuel	0	4	0	4
Nombre total	38	32	49	114

Tableau 14 : Situation des Engagements fermes au 30 septembre 2011 :

Intitulés	Montant en Fcfa	Composante
Etudes Technico-économique seuil touboulana par GROUPE ART ET GENIE	11 966 250	C
Etudes et Suivi contrôle des travaux région de Tahaoua par BETIFOR	34 062 800	C
Etudes et Suivi contrôle travaux piste à Madaoua par LAMCO INGENIERIE	40 375 000	C
Etudes et Suivi contrôle des travaux région de Maradi par MAPTECH	24 428 000	C
Contrat avec Mamouso	448 000	C
Reliquat contrat avec celtel	450 000	D
Reliquat contrat avec Orange	494 556	D
Reliquat contrat Entretien matériel informatique	825 000	D
Reliquat contrat Entretien bureau et gardiennage	855 000	D
Sous projets conventionnés	371 129 008	B
Facture n°11466-003 sofrec	41 066 148	A
Facture Agence Oignon	162 666 122	A
TOTAL ENGAGEMENTS FERMES	688 765 884	
